

COMPTE RENDU

Réunion de chantier du 06/08/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent,

Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à	
MO	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.			raymond.predhomme@laposte.net	A	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	A	
		HUTIN P.			philippe.hutin@wanadoo.fr	A	
		DUDIN J.			syndic.siaboa@akeonet.com	A	
MO	Commune d'ANOR	PERAT J-L.			contact-mairie@anor.fr	P	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	A	x
		PECQUERIE S.			samuel.pecquerie@ville-anor.fr	A	x
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48			P	x
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65		regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12		guillaume.koestel@anteagroup.com	P	x
E	Ent. IDVERDE	BRUYERRE C.	06.76.86.68.43		christophe.bruyerre4@orange.fr	A	x
		RICQUE L.	06.76.12.83.29		laurent.ricque@idverde.com	A	
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14		geoffrey.vandaele@idverde.com	P	x
E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76		laurent.ratte@colas-np.com	P	x
E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31		wattelec2@wanadoo.fr	A	x
AMO	USAGMA	FAUVEL M.	03.23.20.36.74		union-des-syndicats@griv.fr	P	x
		FELZINGER G.				A	
	Commission tvx	FRAILLON M.			fraillon.gm@orange.fr	A	x
		GUILLAUME P.				A	x
	DDTM						
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.			J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	P	x
	CG59	LEDDA C.			carole.ledda@cg59.fr	P	x
		LEMAIRE B.				P	x
	Voirie Départementale	FOUQUART G.			gerard.fouquart@cg59.fr	A	x
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.			houdayer.eptboise@orange.fr	A	x
	Feder. Pêche 59	KLEINPRINTZ G.			gildas@peche59.com	A	X
		PETIT E.				P	x
	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81		s.paye@noreade.fr	P	x

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Comblement de la fosse en aval du pont de la D156, caissons végétalisés, pré-barrage.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Terrassements, canalisations existantes.

Pièce(s) annexe(s)

-

Prochaine réunion

Jeudi 13 août 2015 à 14h.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Réalisation des caissons végétalisés semaines 33 et 34.

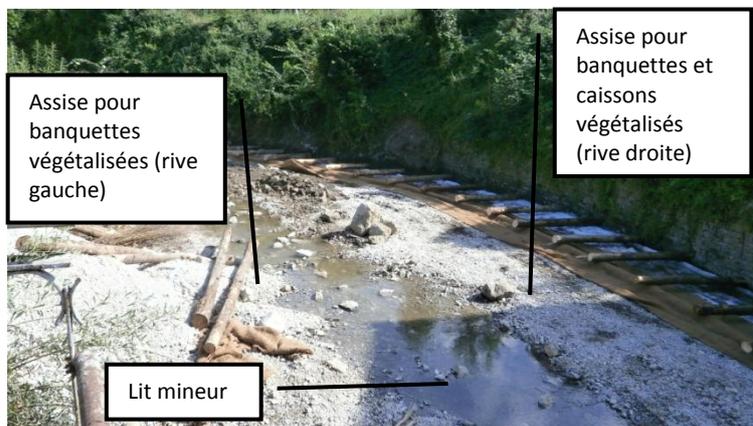
Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Travaux de terrassement semaine 33.

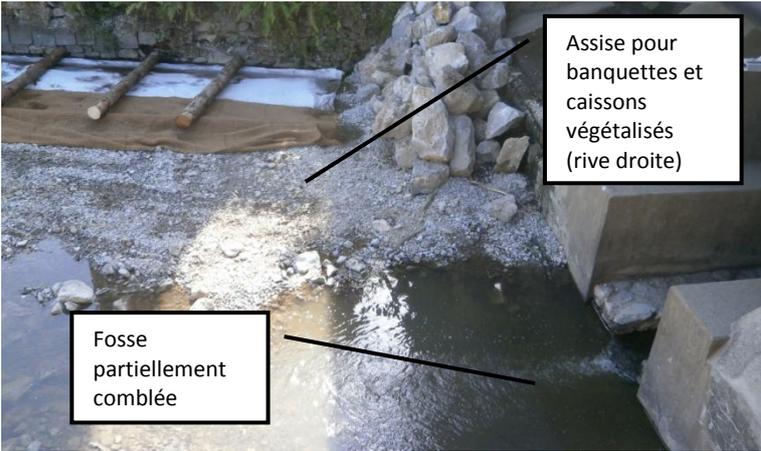
NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
1	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -		
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
3	Travaux préparatoires	<ul style="list-style-type: none"> Un barrage filtrant a été mis en place en aval du linéaire de cours d'eau en cours de travaux. Il est constitué d'un géotextile bidimensionnel mis en place en travers du cours d'eau. 		
4	Travaux	<p>Comblement de la fosse (TF)</p> <ul style="list-style-type: none"> Le comblement de la fosse a été réalisé en début de semaine 32. Les modalités de mise en œuvre indiquées dans le Compte Rendu de réunion n°3 ont été respectées. La fosse a été comblée sur la largeur totale du lit mineur en aval du pont. Les 3ml du cours d'eau situés en aval direct du radier béton (et en amont direct du pré-barrage) n'ont pas été comblés entièrement. Un chenal préférentiel d'écoulement a été réalisé en aval direct du pré-barrage. La largeur de ce chenal préférentiel diminue progressivement jusqu'à obtenir la largeur de lit mineur observée plus en aval. L'assise des caissons et des banquettes végétalisés a été réalisée par apport de matériaux de type 0/100 et de terre sur les enrochements mis en place dans le cadre du comblement de la fosse. La cote altimétrique finie de l'assise des banquettes et des caissons végétalisés permet la mise en place de ces aménagements à fleur d'eau. Le tracé définitif de l'assise des banquettes sera ajusté une fois les caissons végétalisés réalisés (ces derniers nécessitent le passage d'engins sur les assises de banquettes). Un profil de lit mineur plus sinueux sera réalisé. 	ID VERDE	Semaine 35



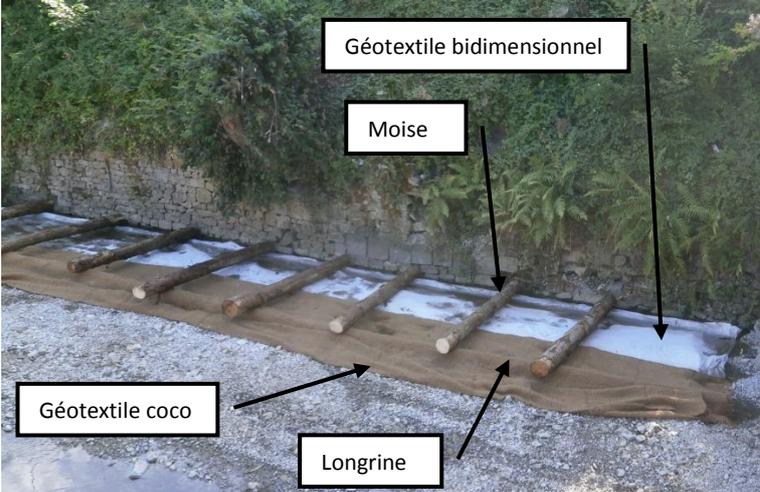
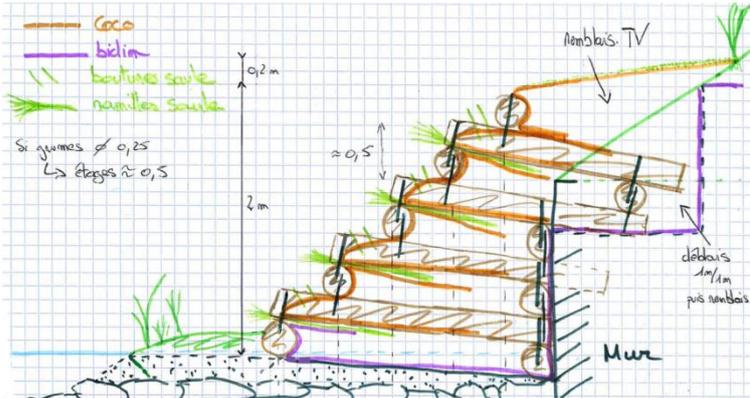
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
4	<i>Travaux</i>	 <p>Fosse partiellement comblée</p> <p>Assise pour banquettes et caissons végétalisés (rive droite)</p> <p>Fosse comblée et assise pour banquettes et caissons végétalisés</p> <p>Pré-barrage (TF)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le pré-barrage a été réalisé en début de semaine 32. ▪ Les modalités de mise en œuvre indiquées dans le CR 3 ont été respectées. ▪ Afin de pouvoir rehausser le niveau d'eau, l'entreprise a du réaliser le pré-barrage sur un linéaire plus important qu'initialement prévu. ▪ Le niveau d'eau a été rehaussé jusqu'à 5cm en dessous de la cote altimétrique du radier béton en sortie de l'ouvrage d'art. ▪ Le profil définitif du pré-barrage sera ajusté une fois les caissons végétalisés réalisés (ces derniers nécessitent le passage d'engins sur les assises de banquettes), à savoir: <ul style="list-style-type: none"> ○ profil en micro-seuil en escalier ; ○ veine préférentielle d'écoulement à réaliser au centre de l'ouvrage.  <p>Pré-barrage</p> <p>Pré-barrage en aval du pont</p>	ID VERDE	Semaine 35

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

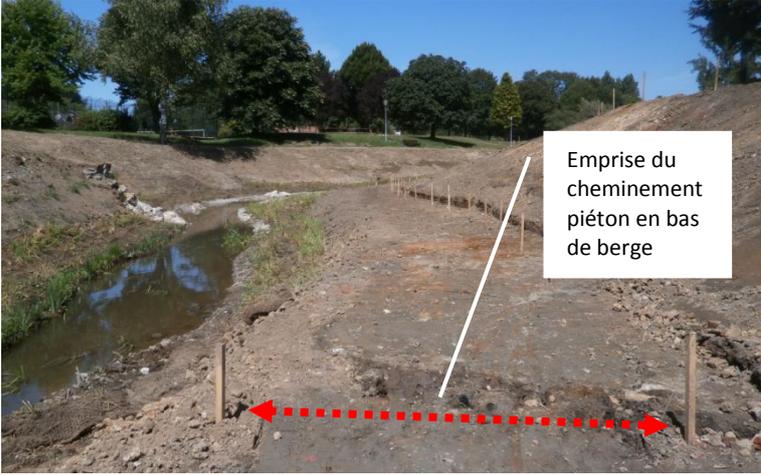
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
4	Travaux	 <p style="text-align: center;"><i>Pré-barrage en aval du pont</i></p> <p>Caissons végétalisés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La réalisation des caissons végétalisés a débuté courant de semaine 32. ▪ Un épi en enrochement a été réalisé en amont direct des caissons, en sortie du réseau. ▪ L'assise des caissons a été légèrement inclinée vers la berge. ▪ Un ancrage des moises dans le talus, sur 2 étages, sera réalisé au dessus du muret en pierres. ▪ 7 étages de caisson seront réalisés (un étage présentant une hauteur d'environ 40cm). ▪ Les caissons seront réalisés en escalier (décalage des moises entre chaque étage d'environ 40cm). ▪ Un géotextile bi-dimensionnel a été mis en place entre les caissons et l'assise, afin d'éviter l'entraînement des fines sous les caissons. ▪ L'entreprise veillera à poser le géotextile coco retenant les terres de manière soignée. ▪ Les matériaux terreux qui seront utilisés pour le remplissage des caissons seront soigneusement compactés.  <p style="text-align: center;"><i>Epi en enrochements</i></p>	ID VERDE	Semaine 33

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
4	Travaux	 <p align="center"><i>Caissons végétalisés en cours de réalisation</i></p>  <p align="center"><i>Caissons végétalisés en cours de réalisation</i></p>  <p align="center"><i>Schéma de réalisation des caissons végétalisés</i></p>		
5	Délais et planning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réalisation des caissons végétalisés semaines 33 et 34 ; ▪ Implantation des caissons situés plus en aval semaine 33. 		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
A	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -	-	-
B	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
C	Travaux	<p>Canalisations existantes en rive gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> La canalisation située le plus en aval, en rive gauche, n'est pas fonctionnelle. Elle sera déposée, en accord avec les services techniques de la commune d'Anor, par l'entreprise MONTARON. La canalisation rejetant les eaux de la place dans le ru des Anorelles ne sera pas raccordée au réseau de NOREADE. Elle sera abaissée, en accord avec les services techniques de la commune d'Anor, par l'entreprise MONTARON. La canalisation ø500 PVC (NOREADE) sera abaissée, en accord avec NOREADE, par l'entreprise MONTARON. Un regard supplémentaire sera mis en place plus en amont, en bordure du cheminement piéton du haut de berge. <p>Travaux de terrassement</p> <ul style="list-style-type: none"> Les travaux de terrassement sont en cours de réalisation. 	<p>Montaron</p> <p>Montaron</p> <p>Montaron</p>	<p>Semaine 33</p> <p>Semaine 33</p> <p>Semaine 33</p>
		 <p>Emprise du cheminement piéton en bas de berge</p> <p>Travaux de terrassement</p>  <p>Emprise du cheminement piéton en bas de berge</p> <p>Travaux de terrassement</p>		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
C	Travaux	 <p data-bbox="692 656 940 680"><i>Travaux de terrassement</i></p>		
D	Planning prévisionnel	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="456 752 1086 777">▪ Fin programmée des travaux de terrassement : semaine 33 		

Le maître d'œuvre

Le 10 août 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
