



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Restauration de la continuité écologique sur le ru du Lerzy à La Capelle

Tranche 2

Compte-rendu de la réunion de chantier 13 Avril 2016

• Lieu :	Sur le site du chantier – à 14h00
-----------------	-----------------------------------

• Maître d'ouvrage : Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	• Maître d'œuvre : Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	• Entreprise : Mascitti Nino SA
--	---	---

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat (SIABOA)	✓		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du SIABOA			✓
MERESSE Guy	Maire de La Capelle			✓
PRUSSE Marie Madeleine	Déleguée syndicat – commune de La Capelle	✓		
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
PACAUD Geoffrey	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre (CCTC)	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti	✓		
BARBIER Mickaël	Entreprise Mascitti	✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de restauration de la continuité écologique sur le ru du Lerzy à La Capelle – tranches 1 et 2 – ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

● **AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

- Les travaux de terrassement se finalisent.
- L'entreprise a réalisé environ 170 ml de lit sur les 200 ml prévus dans le cadre des travaux de réouverture. Les 30 derniers mètres du lit ne seront ouverts qu'en fin de semaine, une fois que la totalité de la berge en rive gauche sera terrassée.
- La partie amont du ruisseau se situe sur une importante zone de décharge (nombreux déchets anthropiques). Afin de limiter l'apport de déchets dans le cours d'eau, il est prévu de légèrement décaler le tracé du lit de la rivière afin de limiter toute pollution du milieu aquatiques à court terme.



Ancienne zone de décharge en amont du tronçon




Décalage du lit pour éviter la pollution du site

- L'entreprise a quasiment terminé le talutage de la rive gauche en pente douce (1/1). Comme demandé, lors de la dernière réunion de chantier, une banquette a été créée en pied de berge. Cette dernière, en pente très douce, facilitera la végétalisation des berges et constituera un lit mineur en période sèche.



Etat initial de la rive gauche

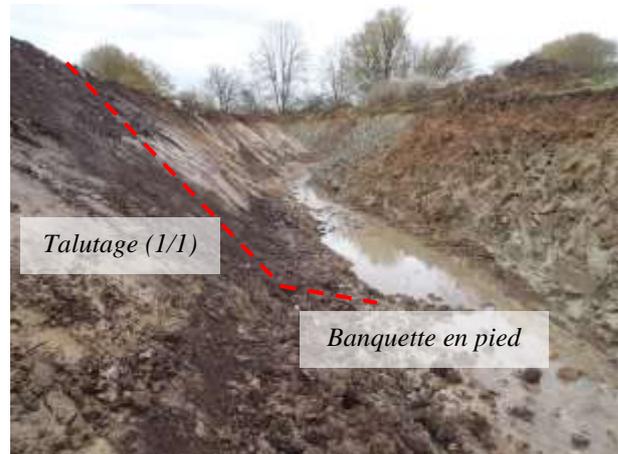

Talutage de la rive gauche (1/1) finalisé

- Les talutages et terrassements ont été validés par le maître d'œuvre lors de cette réunion. Le démontage des buses et la mise en eau du ruisseau est prévu pour la fin de la semaine.
- Le technicien du SIABOA (M.Dudin), se rendra sur place pour constater et vérifier le bon terrassement des 30 ml de lit restant ainsi que le bon fonctionnement hydraulique de la rivière lors de sa mise en eau.

REMARQUES, OBSERVATIONS ET TRAVAUX RESTANTS :

- Aucune remarque particulière n'a été faite par le maître d'œuvre lors de la tenue de cette réunion.
- Opérations restantes à réaliser :
 - ✓ Talutage de rive droite (2/1),
 - ✓ Ratisage grossier des déchets présents à proximité du lit,
 - ✓ Suppression des éléments de la buse pour mise en eau du ruisseau,
 - ✓ Régilage de la terre végétale sur les berges et végétalisation par ensemencement,
 - ✓ Apport et recharge granulométrique du ruisseau,
 - ✓ Création du passage à gué en amont du ru et d'un abreuvoir rustique en aval,
 - ✓ Suppression et comblement du regard en parpaing,
 - ✓ Remise en état du site.



Terrassement de la rive droite à venir



Fin de terrassement du lit et suppression du regard béton

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti Nino SA 06.12.43.28.43
 - M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
 - M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 03.23.97.90.24

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu **le mercredi 20 avril 2016, à 14h00**, sur le site du chantier.

Le service technique,
