

# Travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion sur un sous BV de l'Aisne

## Commune de MAIZY

### Compte-rendu de la réunion de chantier 7 novembre 2023

Lieu :	MAIZY
--------	-------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable	Union des Syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques	SA MASCITTI NINO

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Fonction, Organisme :</b>	Présent	Excusé
GILET Rémy	Président du syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable	✓	
DWORNIK Marie	Animatrice Bassin Versant à l'USAGMA	✓	
BARBIER Mickaël	Conducteur travaux, MASCITTI	✓	


Cette réunion a été initiée afin de suivre l'état d'avancement des travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion sur la commune de MAIZY. Ces travaux confiés à l'entreprise MASCITTI ont débuté le mardi 30 octobre 2023.

### Avancement des travaux :

Conformément aux prescriptions de travaux, l'entreprise a réalisé le débarnage du chemin de la Garenne, le reprofilage du fossé sur le chemin de la montagne, un cassis, une saignée, une noue sur le Chemin du Routy et enfin une noue sur le chemin des petits prés. Une fois le terrassement réalisé, les aménagements ont été directement enherbés par l'entreprise.



Débernage du chemin de la Garenne

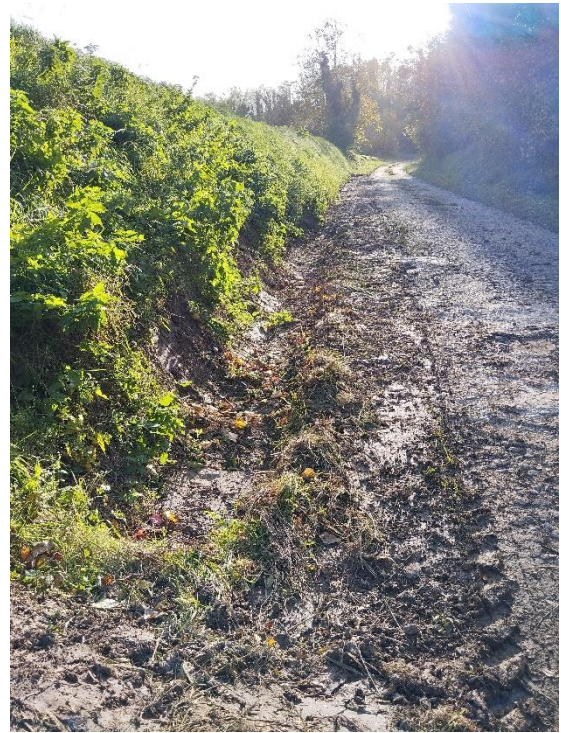

Reprofilage du fossé



Saignée et noue n°1

La noue n° 2 n'ayant pas été effectuée (voir CR de lancement), le premier cassis aurait été davantage initiateur de danger en aval. Celui-ci n'a donc pas été réalisé. Le deuxième, situé plus bas dans le chemin, a donc été renforcé afin d'être plus efficace. De gros enrochements ont été posés pour maintenir l'aménagement. Du béton a été coulé par-dessus, puis peigné. Cet aménagement, bien qu'imposant de part les matériaux utilisés, se devait de rester solide. En effet, les engins agricoles tels que les moissonneuses batteuses des exploitants, empruntent régulièrement ce passage.



Cassis

Concernant la noue n°3, l'entreprise a effectué de petits redents en terre, afin de réduire davantage la vitesse des eaux et permettre une meilleure infiltration.



Noue n°3

### Remarques, observations :

- La remise en état des voies d'accès au chantier a été effectué.



### Date de la prochaine réunion :

La prochaine réunion pour le suivi des travaux aura lieu le vendredi 8 décembre 2023 à 9h30 pour la réalisation des plantations.

Le service Ruissellement Erosion.
