

COMPTE RENDU

Réunion de chantier du 22/10/2014

Participants

Etat : P : présent, A : absent,

Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à	
MO	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.			raymond.predhomme@laposte.net	P	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	A	
		HUTIN P.			philippe.hutin@wanadoo.fr	A	
		DUDIN J.			syndic.siaboa@akeonet.com	A	
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65		regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12		guillaume.koestel@anteagroup.com	P	x
E	Ent. IDVERDE	BRUYERRE C.	06.76.86.68.43		christophe.bruyerre4@orange.fr	P	x
AMO	USAGMA	FAUVEL M.	03.23.20.36.74		union-des-syndicats@griv.fr	A	x
	Commune d'ANOR	PERAT J-L.			contact-mairie@anor.fr	A	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	A	x
		PECQUERIE S.			samuel.pecquerie@ville-anor.fr	A	x
	Commission tvx	FRAILLON M.			fraillon.gm@orange.fr	A	x
		GUILLAUME P.				A	x
	DDTM	DELPYERRE J.	03.28.03.84.19		johnny.delpierre@nord.gouv.fr	A	x
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.			J.Malbrancq@eau-artois-picardie.fr	A	x
	CG59	LEDDA C.			carole.ledda@cg59.fr	A	x
	Voirie Départementale	FOUQUART G.			gerard.fouquart@cg59.fr	A	x
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.			houdayer.eptboise@orange.fr	A	x
	Feder. Pêche 59	KLEINPRINTZ G.			gildas@peche59.com	A	x

Ordre du jour

- Mise en place du pompage, comblement de la fosse en aval du pont.

Pièce(s) annexe(s)

Aucune

Prochaine réunion

Mercredi 29 octobre 2014- 14h30

Planning prévisionnel

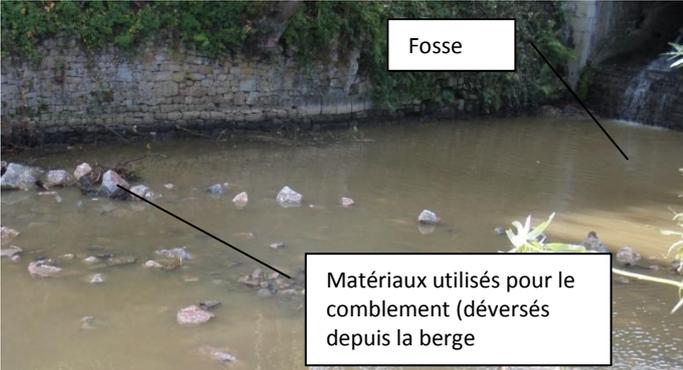
Fin semaine 42 : Imperméabilisation du batardeau amont

Fin semaine 42/ début semaine 43 : début des travaux de reprise de berges et du fond en amont du pont

NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
1	<i>Documents remis / à remettre</i>	Documents remis en réunion - Fiches matériaux (terres pour reprise des berges) Documents à remettre - Chiffrage des enrochements de berge	IDVERDE	Semaine 43
2	<i>Remarque(s) sur le précédent compte-rendu</i>	-	-	-

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
3	<i>Préparation des travaux</i>	<p><u>Divers :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En plus des deux pompes déjà installées (capacités respectives : 200m³/h et 680 m³/h), une troisième pompe (capacité 680 m³/h) a été mise en place le 22/10/2014 ; ▪ la capacité de pompage cumulée des trois pompes permet la baisse significative du niveau d'eau (sous réserve de conditions météorologiques relativement « sèches ») ; ▪ le batardeau amont sera imperméabilisé par la mise en place d'argile ; <div data-bbox="507 495 1193 869" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Ecoulements au niveau du batardeau amont, avant pompage</p> <div data-bbox="507 927 1193 1328" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Ecoulements au niveau du batardeau amont, pendant pompage</p> <div data-bbox="507 1386 1193 1787" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Débit pompé rejeté à l'aval</p>	IDVERDE	Semaine 41

4	Travaux	<p>Enrochements de berges en amont du pont</p> <ul style="list-style-type: none"> le muret existant dans le prolongement des tunages bois présente d'importantes dégradations. Il sera déposé en partie (linéaire fissuré uniquement).  <p>Muret en pierre dans le prolongement des tunages bois</p>  <p>Fissure dans le muret</p>		
4	Travaux	<p>Fosse en aval du pont</p> <ul style="list-style-type: none"> les travaux de comblement de la fosse située en aval du pont ont débuté semaine 42. Les matériaux utilisés sont des enrochements 300/600mm.  <p>Travaux de comblement de la fosse aval</p>	IDVERDE	Semaine 41
