

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques et de valorisation du Ru des Anorelles dans le centre-bourg d'Anor (59)

Syndicat Intercommunal de Gestion du Bassin Versant de l'Oise Amont/ Commune d'Anor

Compte rendu de chantier

RC 13

COMPTE RENDURéunion de chantier du 13/08/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent	Ftat	. Р	présent.	Α:	absent.
--------------------------------	------	-----	----------	----	---------

	Etat : P : présent, A : absent,						
	Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à
	T	T	T	1			T
	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.			raymond.predhomme@laposte.net	Р	
МО		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	Р	x
IVIO	Sylla. SIABOA	HUTIN P.			philippe.hutin@wanadoo.fr	Α	^
		DUDIN J.			syndic.siaboa@akeonet.com	Α	
		PERAT J-L.			contact-mairie@anor.fr	Р	х
140	Commune	BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	Р	x
MO	d'ANOR	PECQUERIE S.			samuel.pecquerie@ville-anor.fr	Α	x
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48			Α	Х
		MOLINARI R.	06.88.53.20.65		regis.molinari@anteagroup.com	Α	х
Moe	Antea Group	KOESTEL G.	06.19.19.65.12		guillaume.koestel@anteagroup.com	Р	х
		BRUYERRE C.	06.76.86.68.43		christophe.bruyerre4@orange.fr	Α	х
Ε	Ent. IDVERDE	RICQUE L.	06.76.12.83.29		laurent.ricque@idverde.com	Α	
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14		geoffrey.vandaele@idverde.com	Р	х
E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76		laurent.ratte@colas-np.com	Р	х
E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31		wattelec2@wanadoo.fr	Α	х
	USAGMA	FAUVEL M.			Α		
AMO		FELZINGER G.	03.23.20.36.74		union-des-syndicats@griv.fr	Α	x
		PACAUD G.				Р	
			_			ı	1
	Commission tvx	FRAILLON M.			fraillon.gm@orange.fr	Α	х
	Commission tvx	GUILLAUME P.				Α	х
	DDTM						
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.			J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	Α	x
		LEDDA C.			carole.ledda@cg59.fr	Α	х
	CG59	LEMAIRE B.				Α	х
	Voirie Départementale	FOUQUART G.			gerard.fouquart@cg59.fr	А	х
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.			houdayer.eptboise@orange.fr	А	x
·	Fada a Bâda 50	KLEINPRINTZ G.			gildas@peche59.com	Α	Х
	Feder. Pêche 59	PETIT E.				Р	х
	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81		s.paye@noreade.fr	Α	х

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Caissons végétalisés, ouvrages situés entre le pont de la D156 et le pont de la rue Fostier Bayard.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Terrassements, canalisations existantes.

Pièce(s) annexe(s)

_

Prochaine réunion

Jeudi 27 août 2015 à 14h.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Réalisation des caissons végétalisés semaines 34 et 35.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Fin des travaux de terrassement semaine 33.


NB: le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

	Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles						
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action			
1	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -					
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-			
3	Travaux préparatoires	 Le barrage filtrant mis en place sera déplacé en aval du pont de la rue Fostier Bayard. 	ID VERDE	Semaine 34			
4	Travaux	Caissons végétalisés Les caissons végétalisés sont en cours de réalisation. 5 étages de caissons ont été réalisés à la date du 13/08/2015. Les plançons de saule seront « piqués » au sein des caissons lorsque les conditions climatiques seront plus favorables (moins sèches), afin d'en assurer la reprise. Caissons végétalisés en cours de réalisation	ID VERDE	Fin 09/2015			
		Limite haute du muret en pierre existant Géotextile coco Longrine Caissons végétalisés en cours de réalisation					

		Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles		
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
4	Travaux	Ouvrages situés entre le pont de la D156 et le pont de la rue Fostier Bayard La pré-implantation de ces ouvrages a été réalisée le 13/08/2015. Les aménagements à mettre en place sont de type caissons végétalisés et banquettes végétalisées. Les paramètres suivants ont été pris en compte pour l'implantation des ouvrages et du tracé du lit mineur ré-aménagé : largeur du lit d'étiage : entre 1,5m et 2m; conservation d'un profil alternant radiers/ mouilles; tracé sinueux à redonner au lit d'étiage; présence ou non de plantes hélophytes, délimitant le lit d'étiage « naturel » actuel; présence ou non de banquettes existantes au sein du lit mineur; les banquettes existantes présentant une diversité floristique intéressante et cohérente avec le milieu seront conservées en l'état; les banquettes existantes présentant peu d'intérêt floristique seront arasées et recouvertes de nattes pré-végétalisées. Des rubalises seront mises en place en début de semaine 34 afin d'implanter précisément l'emprise du lit d'étiage ré-aménagé. Les terrassements débuteront une fois l'implantation des aménagements validée. Les terrassements débuteront une fois l'implantation des aménagements validée.	ID VERDE	Semaine 34

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
4	Travaux	Légende Localisation des aménagements de banquettes et de caissons végétalisés (extrait du plan PRO) Caissons amont: Caissons amont D 350 Caissons aval D 351 D 351 D 352 Caissons aval D 348 D 349 D 349 D 349 D 349 D 348 D 349 D 3		

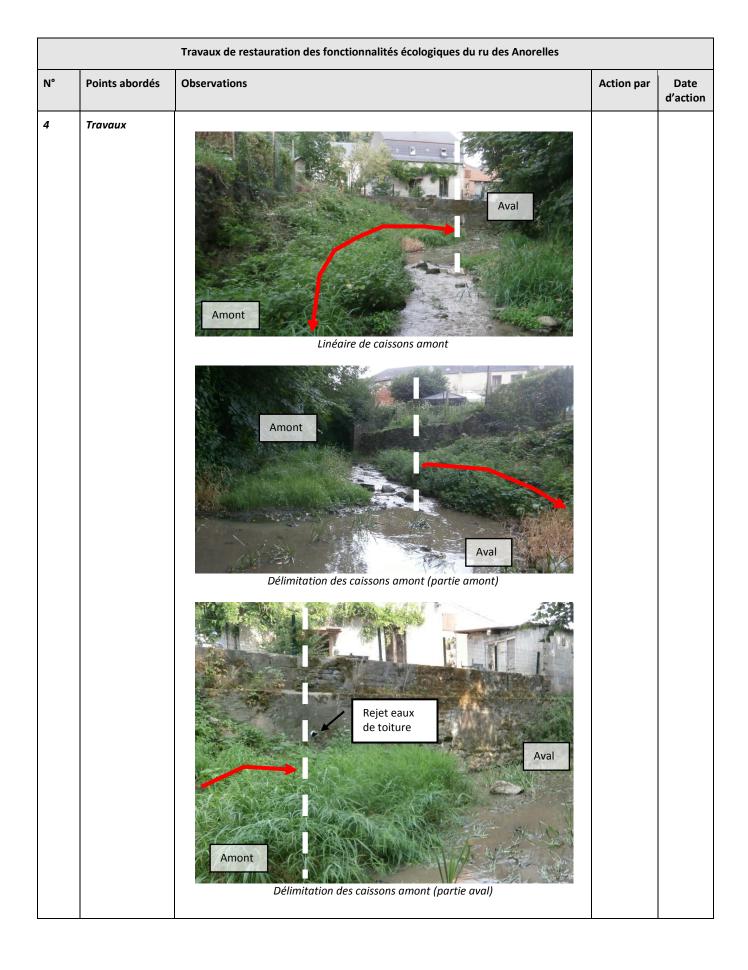

		Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles		
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		Caissons aval: ils seront ancrés dans la berge; ils présenteront une hauteur d'environ 1,60m (hauteur actuelle du terrain naturel en haut de berge); ils prendront leur emprise sur le lit mineur sur environ 1m; la clôture présente en rive gauche sera déposée par le propriétaire. Amont Caissons aval Caissons aval Délimitation des coissons aval (partie amont)		

	Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles						
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action			
		Banquette à mettre en place Banquette à mettre en rive droite à conserver Modification du tracé du lit d'étiage					
5	Délais et planning	 Finition des caissons végétalisés en aval du pont de la D156 semaine 34; Début des travaux sur le linéaire situé entre le pont de la D156 et le pont de la rue Fostier Bayard semaine 34. 					

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

		Travaux de valorisation du ru des Anorelles		
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
A	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -	-	-
В	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
C	Travaux	Canalisations existantes en rive gauche La canalisation située le plus en aval, en rive gauche, a été déposée. La canalisation rejetant les eaux de la place dans le ru des Anorelles a été abaissée. La canalisation ø500 PVC (NOREADE) a été abaissée. Un regard supplémentaire a été mis en place plus en amont, en bordure du cheminement piéton du haut de berge. Les deux canalisations seront recoupées lors de la finalisation des travaux. Les talus seront habillés en enrochements pour limiter les phénomènes d'affouillement sous les canalisations. Canalisation de rejet des eaux de la place (NOREADE) Canalisations abaissées Travaux de terrassement Les travaux de terrassement sont en cours de finition. Emprise du cheminement piéton en bas de berge Travaux de terrassement	ID VERDE	Travaux de finition

		Travaux de valorisation du ru des Anorelles	
С	Travaux	Travaux de terrassement- Emprise du belvédère et du ponton d'observation en bas de berge	
D	Planning prévisionnel	■ Fin des travaux de terrassement : semaine 33	

Le maître d'œuvre Le 17 août 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
