

COMPTE RENDU

Réunion de chantier du 08/10/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent, E : Excusé

Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à
MO	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.		raymond.predhomme@laposte.net	P	x
		BAILLEUL B.		bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	
		HUTIN P.		philippe.hutin@wanadoo.fr	A	
		DUDIN J.		syndic.siaboa@akeonet.com	A	
MO	Commune d'ANOR	PERAT J-L.		contact-mairie@anor.fr	P	x
		BAILLEUL B.		bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	x
		PECQUERIE S.		samuel.pecquerie@ville-anor.fr	P	x
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48			A
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65	regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12	guillaume.koestel@anteagroup.com	P	x
E	Ent. IDVERDE	BRUYERRE C.	06.76.86.68.43	christophe.bruyerre4@orange.fr	P	x
		RICQUE L.	06.76.12.83.29	laurent.ricque@idverde.com	A	
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14	geoffrey.vandaele@idverde.com	A	x
E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76	laurent.ratte@colas-np.com	A	x
E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31	wattelec2@wanadoo.fr	P	x
AMO	USAGMA	FAUVEL M.	03.23.20.36.74	union-des-syndicats@griv.fr	P	x
		FELZINGER G.			A	
		PACAUD G.			A	
	Commission tvx	FRAILLON M.		fraillon.gm@orange.fr	A	x
		GUILLAUME P.			A	x
	DDTM					
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.		J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	A	x
	CG59	LEDDA C.		carole.ledda@cg59.fr	A	x
		LEMAIRE B.			A	x
	Voirie Départementale	FOUQUART G.		gerard.fouquart@lenord.fr	P	x
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.		houdayer.eptboise@orange.fr	A	x
	Feder. Pêche 59	KLEINPRINTZ G.		gildas@peche59.com	A	X
		PETIT E.			A	x
	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81	s.paye@noreade.fr	A	x

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Diversification des écoulements, lit mineur, banquettes végétalisées, caissons végétalisés, aménagement de berge (Mme Bosquet).

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Cheminement piéton de bas de berge, éclairages, plantations, ponton d'observation de bas de berge.

Pièce(s) annexe(s)

-

Prochaine réunion

Jeudi 22 octobre 2015 à 14h.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Recépage des caissons végétalisés courant de semaine 42.
- Finition de l'ensemble des aménagements au sein du lit mineur (reprise de berge, reprise d'atterrissement, épi en enrochement) avant fin 10/2015.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Réalisation du ponton d'observation de bas de berge semaine 42.
- Mise en place des voliges supplémentaires sur le cheminement piéton de bas de berge semaine 42.

NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
1	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -		
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
3	Travaux	<p>Banquettes végétalisées</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suite aux événements pluvieux du mois de septembre, une partie de l'ensemencement réalisé sur les banquettes végétalisées a été transportée vers l'aval par les écoulements. ▪ La reprise de l'ensemencement des banquettes sera surveillé et un ensemencement complémentaire pourra être prévu courant printemps 2016.  <p><i>Exemple de banquette ensemencée à surveiller</i></p> <p>Caissons végétalisés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le reprise des ramilles mises en place au sein des caissons courant septembre a été observée. ▪ En complément, l'ensemble du linéaire de caissons végétalisés a fait l'objet de plantations de plançons de saule. ▪ Les plançons présentent une longueur d'environ 2m et sont piqués au sein des caissons sur 0,5m à 1m. ▪ Les plançons seront recepés afin qu'ils dépassent des caissons sur environ 0,5m ; les produits du recépage seront repiqués au sein des caissons.  <p><i>Plançons à recéper</i></p>	ID VERDE	Semaine 42

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		<p><u>Aménagement de berge (Mme Bosquet)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Un muret en pierre (fortement dégradé) était présent en bordure de la propriété de Mme Bosquet, coté cours d'eau. ▪ En cas de crue, ce muret constituait un obstacle aux écoulements. Une érosion avancée de la berge située directement en amont (en contrebas de la propriété de Mme Bosquet) était alors observée. ▪ Le muret a été en partie déposé, afin de supprimer cet obstacle aux écoulements. ▪ Des blocs en enrochement (600 à 800kg) ont été mis en œuvre en pied de berge afin de stabiliser la berge et de la protéger des phénomènes d'érosion. ▪ Des matériaux ont été mis en place au dessus des enrochements afin de reconstituer le talus. Ce dernier a été ensemencé. ▪ Les problématiques observées sont donc solutionnées par la réalisation des aménagements décrits ci-dessus. ▪ En complément, l'entreprise mettra en œuvre à mi-hauteur de berge des plançons de saule (ø3cm environ), à raison de deux boutures/ml, sur deux rangées. ▪ Le système racinaire des saules permettra de renforcer la stabilisation du talus. ▪ L'érable situé en pied de berge sera étêté manuellement par l'entreprise. <div data-bbox="435 1137 1198 1653" style="text-align: center;">  <p><i>Aménagement de berge (Mme Bosquet)</i></p> </div> <p><u>Tracé du lit mineur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La partie non végétalisée de l'atterrissement situé sous la passerelle d'accès au parc Despret sera terrassée afin d'augmenter la largeur du lit d'étiage (cf. CR n°16). 	<p>ID VERDE</p> <p>ID VERDE</p>	<p>Semaine 42</p> <p>Semaine 42</p>

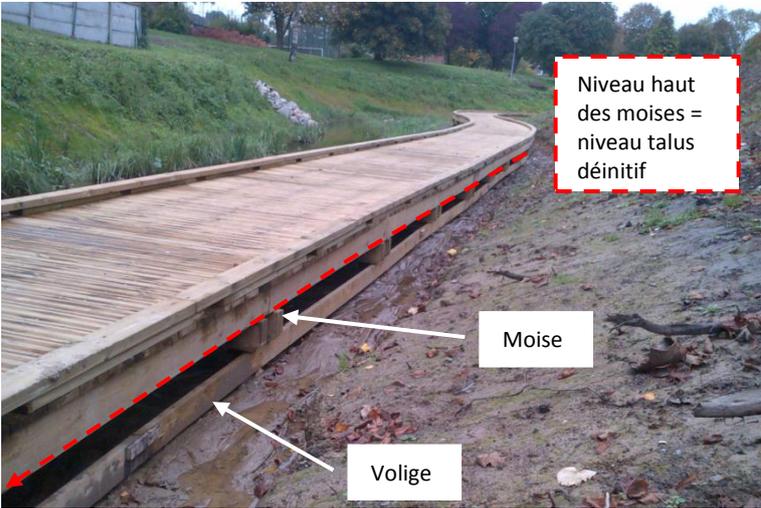
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		<p>Diversification des écoulements</p> <ul style="list-style-type: none"> Un épi en enrochements sera mis en place en sortie de la canalisation d'eaux pluviales présentées ci-dessous (cf. CR 11)  <p align="center"><i>Epi en enrochements à mettre en oeuvre</i></p>	ID VERDE	Semaine 42
4	Délais et planning	<ul style="list-style-type: none"> Recépage des caissons végétalisés courant de semaine 42. Finition de l'ensemble des aménagements au sein du lit mineur (reprise de berge, reprise d'atterrissement, épi en enrochement) <u>avant fin 10/2015.</u> 		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
A	Documents remis / à remettre	<p>Documents remis en réunion</p> <p>-</p> <p>Documents à remettre</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiches matériaux des ouvrages bois mises à jour 	ID VERDE	Semaine 42
B	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
C	Travaux	<p>Eclairage et mise en lumière</p> <ul style="list-style-type: none"> En accord avec la commune, les candélabres situés en haut de berge seront constitués de lampes halogènes afin d'assurer un éclairage suffisant de la zone aménagée. La mise en valeur du linéaire en aval du pont de la D156, par la mise en place de deux spots d'éclairage, a été étudiée avec le Conseil Départemental. La mise en place de dispositifs d'éclairage de dimensions et poids limités (300g /u environ) sans perçage du tablier et des piles de pont est autorisée par le Conseil Départemental. L'entreprise WATTELEC fournira un schéma de principe de pose des dispositifs, pour la validation auprès du Conseil Départemental. <p>Ouvrages bois</p> <ul style="list-style-type: none"> Le platelage du cheminement piéton en bas de berge a été finalisé courant de semaine 40. Les chasse-roues ont été mis en œuvre le long du piétonnier. L'escalier situé le plus en aval a été réalisé. Du stabilisé sera mis en place sur le replat situé au centre de l'escalier. Des voliges ont été mises en place en pied du platelage. Des voliges supplémentaires seront mises en place afin de retenir les matériaux à mettre en place en vue de la finalisation du talus. Le niveau du pied de talus correspondra au niveau haut des moises. 	<p>WATTELEC</p> <p>ID VERDE</p>	<p>Semaine 42</p> <p>Semaine 42</p>
		 <p>Cheminement piéton de bas de berge (vue vers l'aval)</p>		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
C	Travaux	 <p><i>Cheminement piéton de bas de berge (vue vers l'amont)</i></p>  <p><i>Cheminement piéton de bas de berge (vue vers l'amont)</i></p>  <p>Escalier (10 marches)</p> <p>Replat</p> <p>Escalier (10 marches)</p> <p><i>Escalier aval</i></p>  <p>Niveau haut des moises = niveau talus déinitif</p> <p>Moise</p> <p>Volige</p> <p><i>Cheminement piéton</i></p>		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les pieux constituant la structure porteuse du ponton d'observation de bas de berge présentent une longueur de 5m (chêne). ▪ Ils ont été battus mécaniquement jusqu'à refus (hauteur hors sol d'environ 1m). ▪ 3 couches de géotextile ont été mises en place sur la berge de la rive gauche, en amont et en aval de la passerelle d'accès au parc Despret (en lieu et place des anciens foyers de renouée).  <p style="text-align: center;"><i>Ponton d'observation de bas de berge -Pieux battus</i></p> <p>Plantations</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En accord avec la commune et le Syndicat, les 8 tilleuls présents actuellement sur la place du 11 novembre seront abattus et dessouchés. ▪ La quantité d'arbres en cépée à planter en haut de berge, prévue dans le marché, reste inchangée (12 unités). L'espacement entre les arbres sera augmenté. 		
D	Délais et planning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réalisation du ponton d'observation de bas de berge semaine 42. ▪ Mise en place des voliges supplémentaires sur le cheminement piéton de bas de berge semaine 42. 		

Le maître d'œuvre

Le 9 Octobre 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
