

 anteagroup Maître d'œuvre	Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques et de valorisation du Ru des Anorelles dans le centre-bourg d'Anor (59) Syndicat Intercommunal de Gestion du Bassin Versant de l'Oise Amont/ Commune d'Anor	Compte rendu de chantier RC 18
--	--	---

COMPTE RENDU

Réunion de chantier du 22/10/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent, E : Excusé

Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à
MO	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.		raymond.predhomme@laposte.net	P	x
		BAILLEUL B.		bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	
		HUTIN P.		philippe.hutin@wanadoo.fr	A	
		DUDIN J.		syndic.siaboa@akeonet.com	A	
MO	Commune d'ANOR	PERAT J-L.		contact-mairie@anor.fr	A	x
		BAILLEUL B.		bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	x
		PECQUERIE S.		samuel.pecquerie@ville-anor.fr	A	x
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48		A	x
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65	regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12	guillaume.koestel@anteagroup.com	P	x
E	Ent. IDVERDE	BRUYERRE C.	06.76.86.68.43	christophe.bruyerre4@orange.fr	P	x
		RICQUE L.	06.76.12.83.29	laurent.ricque@idverde.com	A	
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14	geoffrey.vandaele@idverde.com	A	x
E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76	laurent.ratte@colas-np.com	A	x
E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31	wattelec2@wanadoo.fr	A	x
AMO	USAGMA	FAUVEL M.	03.23.20.36.74	union-des-syndicats@griv.fr	A	x
		FELZINGER G.			P	
		PACAUD G.			A	
	Commission tvx	FRAILLON M.		fraillon.gm@orange.fr	A	x
		GUILLAUME P.			A	x
	DDTM					
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.		J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	A	x
	CG59	LEDDA C.		carole.ledda@cg59.fr	A	x
		LEMAIRE B.			A	x
	Voirie Départementale	FOUQUART G.		gerard.fouquart@lenord.fr	A	x
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.		houdayer.eptboise@orange.fr	A	x
	Feder. Pêche 59	KLEINPRINTZ G.		gildas@peche59.com	A	X
		PETIT E.			A	x
	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81	s.paye@noreade.fr	A	x

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Epi en enrochements, banquettes végétalisées et atterrissements, caissons végétalisés, aménagement de berge (Mme Bosquet), canalisations.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Cheminement piéton (bas de berge et haut de berge), plantations, ponton d'observation de bas de berge, gradins, habillage des talus.

Pièce(s) annexe(s)

-

Prochaine réunion

Jeudi 5 Novembre 2015 à 14h.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Finition de l'ensemble des aménagements au sein du lit mineur avant la fin de semaine 44.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Finition du ponton d'observation de bas de berge semaine 44.
- Réalisation des gradins semaine 44.
- Ensemencement du talus semaine 44.

NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
1	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -		
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
3	Travaux	Banquettes végétalisées - Les derniers pieux en châtaignier mis en place (pour le maintien des nattes végétalisées) seront recépés si besoin.  <i>Exemple de pieux à recéper</i> - Les dernières surfaces de nattes végétalisées ont été mises en place en rive gauche, en amont et au droit du ponton d'observation de bas de berge.  <i>Nattes végétalisées posées en rive gauche</i>	ID VERDE	Semaine 44

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		<u>Caissons végétalisées</u> - Les plançons ont été recépés et les produits du recépage repiqués au sein des caissons.  <i>Plançons recépés</i> <u>Aménagement de berge (Mme Bosquet)</u> - L'entreprise a mis en œuvre à mi-hauteur de berge des plançons de saule (ø3cm environ), à raison de deux boutures/ml, sur deux rangées. - L'érable situé en pied de berge a été étêté manuellement le 22/10/2015.  <i>Aménagement de berge (Mme Bosquet)</i> <u>Tracé du lit mineur</u> - La partie non végétalisée de l'atterrissement situé sous la passerelle d'accès au parc Despret a été terrassée. - Des nattes végétalisées ont été mises en place sur l'atterrissement.  <i>Atterrissement repris</i>		

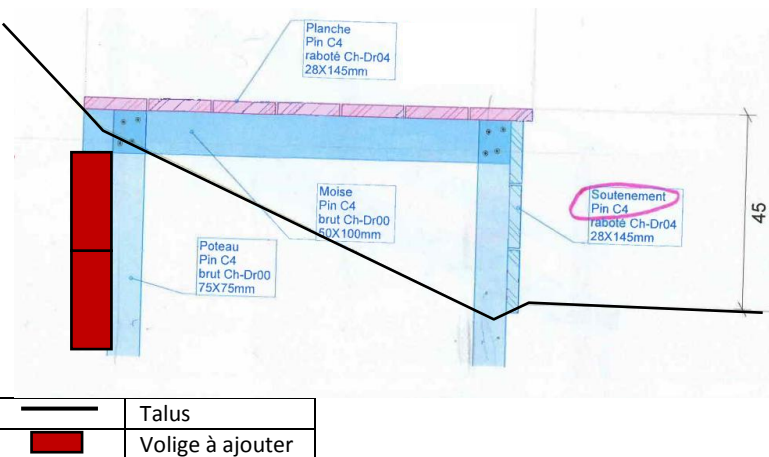
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		<u>Diversification des écoulements</u> - Un épi en enrochements sera mis en place en sortie de la canalisation d'eaux pluviales présentées ci-dessous (cf. CR 11)  <i>Epi en enrochements à mettre en œuvre</i> <u>Canalisations</u> - La canalisation abaissée par l'entreprise Montaron (concessionnaire NOREADE) sera découpée en biais afin de limiter son impact esthétique. - Les enrochements disposés autour de la canalisation seront redispisés en aval direct du collecteur afin de protéger la berge des phénomènes d'érosion.  <i>Canalisation à découper</i>	ID VERDE	Semaine 44
			ID VERDE	Semaine 44
4	Délais planning et	Finition de l'ensemble des aménagements au sein du lit mineur <u>avant la fin de semaine 44.</u>		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
A	<i>Documents remis / à remettre</i>	Documents remis en réunion - Documents à remettre	ID VERDE	Semaine 42
B	<i>Remarque(s) sur le précédent compte-rendu</i>	-	-	-
C	<i>Travaux</i>	Habillage du talus rive gauche ▪ L'ensemble du talus (rive gauche) situé en aval du ponton d'observation a été habillé en terre végétale sur 30cm d'épaisseur. ▪ Le talus situé sous la passerelle d'accès au parc Despret présente une pente trop importante pour la mise en place de terre végétale. ▪ Un géotextile coco sera mis en place et ensemencé afin de recouvrir le géotextile bidimensionnel (procédé identique à celui mis en œuvre lors de la première phase de travaux).  <i>Talus à habiller en géotextile coco + ensemencement</i> Ouvrages bois ▪ Des voliges supplémentaires ont été mises en place afin de retenir la terre végétale du talus.  <i>Cheminement piéton de bas de berge et talus habillé en terre végétale (vue vers l'aval)</i>	ID VERDE	Semaine 44

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
C	Travaux	 <i>Cheminement piéton de bas de berge et talus habillé en terre végétale (vue vers l'amont)</i>  <i>Cheminement piéton de bas de berge et talus habillé en terre végétale (vue vers l'amont)</i> - Le ponton d'observation de bas de berge est en cours de finalisation. - La liste des espèces hélophytes à mettre en œuvre dans la partie ouverte du ponton sera communiquée à l'entreprise. Les espèces à mettre en œuvre présenteront des hauteurs variées. - Le premier gradin (bas de berge) a été réalisé. - Le marché prévoyait la mise en place de murs de soutènement (hauteurs 50cm et 90cm) au droit des gradins. - Pour des raisons financières et techniques (matériaux sous-jacents fuyants sur les 2 premiers mètres de profondeur), les murs de soutènement ont été remplacés par la structure présentée ci-après. - Des pieux identiques à ceux utilisés pour le ponton d'observation de bas de berge (120mm*120mm en chêne) ont été battus afin d'atteindre des matériaux sous-jacents suffisamment porteurs. - La structure porteuse des gradins a été fixée aux pieux ainsi battus. - De même que pour le cheminement piéton de bas de berge, un géotextile et des voliges seront mis en place afin de retenir le talus amont.	Antea Group	Semaine 44

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action				
		<table><tr><td></td><td>Talus</td></tr><tr><td></td><td>Volige à ajouter</td></tr></table> Structure porteuse des gradins et voliges à ajouter  Ponton d'observation de bas de berge  Ponton d'observation de bas de berge  Ponton d'observation de bas de berge		Talus		Volige à ajouter		
	Talus							
	Volige à ajouter							

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		<u>Cheminement piéton de haut de berge</u> ▪ Un échantillon de stabilisé a été proposé à la commune (provenance : CBS Limont Fontaine, couleur gris clair). ▪ La commune validera ou non le matériau proposé. <u>Plantations</u> ▪ En accord avec la commune, en plus des 8 tilleuls à déposer (convenus lors de la réunion du 08/10/2015), 2 autres tilleuls supplémentaires seront abattus et dessouchés. ▪ La quantité d'arbres en cépée à planter en haut de berge, prévue dans le marché, reste inchangée (12 unités). L'espacement entre les arbres sera augmenté. ▪ Lors des travaux de plantation des massifs arbustifs, l'entreprise mettra en œuvre des plants de saule aux abords de la canalisation d'eau pluviale située en rive droite (en face du ponton d'observation), afin de limiter son impact esthétique.	Commune d'Anor	Semaine 44
D	Délais <i>et</i> planning	▪ Finition du ponton d'observation de bas de berge semaine 44. ▪ Réalisation des gradins semaine 44. ▪ Ensemencement du talus semaine 44.		

Le maître d'œuvre

Le 23 Octobre 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
