

COMPTE RENDU

Réunion de chantier du 19/11/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent, E : Excusé

Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à	
MO	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.			raymond.predhomme@laposte.net	E	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	
		HUTIN P.			philippe.hutin@wanadoo.fr	A	
		DUDIN J.			syndic.siaboa@akeonet.com	P	
MO	Commune d'ANOR	PERAT J-L.			contact-mairie@anor.fr	A	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	x
		PECQUERIE S.			samuel.pecquerie@ville-anor.fr	A	x
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48			P	x
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65		regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12		guillaume.koestel@anteagroup.com	P	x
E	Ent. IDVERDE	BRUYERRE C.	06.76.86.68.43		christophe.bruyerre4@orange.fr	P	x
		RICQUE L.	06.76.12.83.29		laurent.ricque@idverde.com	A	
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14		geoffrey.vandaele@idverde.com	A	x
E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76		laurent.ratte@colas-np.com	A	x
E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31		wattelec2@wanadoo.fr	A	x
AMO	USAGMA	FAUVEL M.	03.23.20.36.74		union-des-syndicats@griv.fr	E	x
		FELZINGER G.				A	
		PACAUD G.				A	
	Commission tvx	FRAILLON M.			frailon.gm@orange.fr	A	x
		GUILLAUME P.				A	x
	DDTM						
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.			J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	A	x
	CG59	LEDDA C.			carole.ledda@cg59.fr	A	x
		LEMAIRE B.				A	x
	Voirie Départementale	FOUQUART G.			gerard.fouquart@lenord.fr	A	x
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.			houdayer.eptboise@orange.fr	A	x
	Feder. Pêche 59	KLEINPRINTZ G.			gildas@peche59.com	A	X
		PETIT E.				A	x
	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81		s.paye@noreade.fr	A	x

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Plantations.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Cheminement piéton (haut de berge), gradins, belvédère (haut de berge), accès à la rive gauche (amont du pont de la rue Fostier Bayard), panneaux d'interprétation.

Pièce(s) annexe(s)

-

Prochaine réunion

Jeudi 3 décembre 2015 à 14h.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles


- Plantations semaine 48
- Ensemencement du talus semaine 48.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Mise en place des dispositifs d'éclairage semaine 49


NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

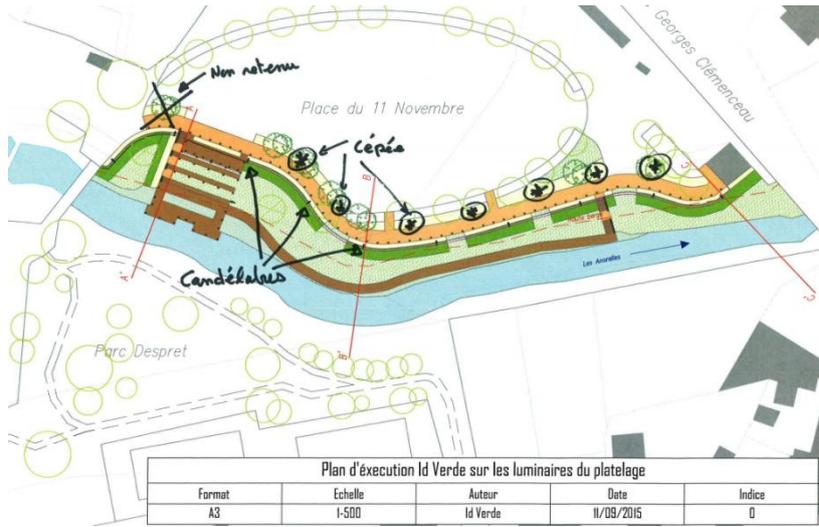Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles																			
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action															
1	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -																	
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-															
3	Travaux	<p>Plantations : arbres en cépée</p> <ul style="list-style-type: none"> A la demande de la commune, la plantation du premier arbre en cépée (en amont) sera décalée afin de permettre la circulation des véhicules lors des prochaines ducasses. Au total, 7 arbres en cépée seront mis en place en rive gauche du cours d'eau (espacement d'environ 11m). Ils seront disposés en quinconce vis-à-vis des candélabres. L'ensemble des 12 arbres en cépée ayant d'ores et déjà été commandé par l'entreprise, les plants restant seront plantés en rive droite du cours d'eau (en quinconce vis-à-vis de ceux plantés en rive gauche).  <table border="1" data-bbox="550 1451 1225 1518"> <thead> <tr> <th colspan="5">Plan d'exécution Id Verde sur les luminaires du platelage</th> </tr> <tr> <th>Format</th> <th>Echelle</th> <th>Auteur</th> <th>Date</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A3</td> <td>1-500</td> <td>Id Verde</td> <td>11/09/2015</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Localisation des arbres en cépée (rive gauche)</p>	Plan d'exécution Id Verde sur les luminaires du platelage					Format	Echelle	Auteur	Date	Indice	A3	1-500	Id Verde	11/09/2015	0		
Plan d'exécution Id Verde sur les luminaires du platelage																			
Format	Echelle	Auteur	Date	Indice															
A3	1-500	Id Verde	11/09/2015	0															
4	Délais et planning	<ul style="list-style-type: none"> Plantations des arbres en cépée semaine 48 Ensemencement du talus semaine 48. 																	

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
A	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -		
B	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	<p>Ouvrages bois</p> <ul style="list-style-type: none"> Les replats entre chaque gradin ont été habillés en terre végétale. Ils seront par la suite ensemencés. Le belvédère a été refermé coté gradins par la mise en place d'un bardage supplémentaire (devis accepté par la mairie). Les mains courantes manquantes ont été mises en place sur le belvédère et sur le ponton d'observation de bas de berge. 		

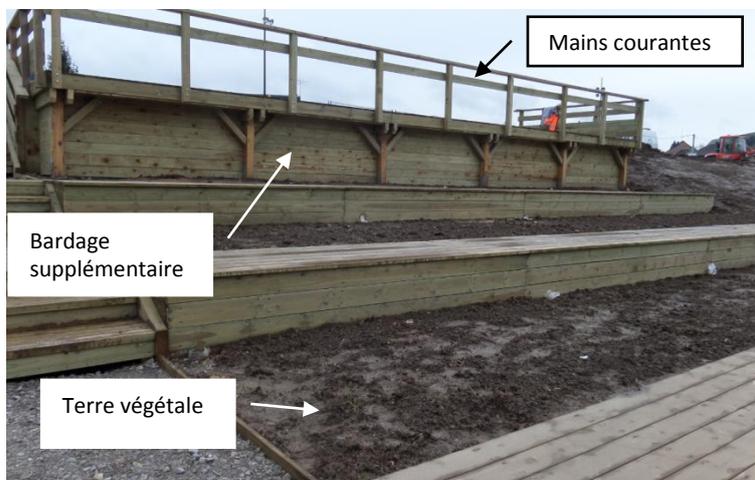

Gradins+ escaliers + belvédère



Belvédère

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
C	Travaux	 <p style="text-align: center;"><i>Ponton d'observation de bas de berge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les replats des escaliers (amont et aval) ont été mis à niveau par apport et compactage de GNT. ▪ Restera à mettre en place le stabilisé sur 8cm d'épaisseur.  <p style="text-align: center;"><i>Escaliers amont</i></p>		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
C	Travaux	<p><u>Cheminement piéton de haut de berge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les fourreaux et gaines pour la réalisation des éclairages ont été mis en place. ▪ Un géotextile a été mis en place sur l'ensemble de l'emprise du cheminement piéton de haut de berge. ▪ La mise en place et le compactage des GNT pour la constitution de l'assise du cheminement piéton sont en cours de réalisation. ▪ Les voliges ont été mises en place sur l'ensemble du linéaire du cheminement piéton. <div style="text-align: center;">  <p>Voliges</p> <p><i>Cheminement piéton de haut de berge (vue vers l'aval)</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Géotextile</p> <p>Voliges</p> <p><i>Cheminement piéton de haut de berge (vue vers l'amont)</i></p> </div>	ID VERDE	Semaine 48

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		<ul style="list-style-type: none"> L'ancien massif planté présent à l'entrée de la place a été déposé dans sa totalité. L'emprise correspondante sera ensemencée en graminées.  <p style="text-align: center;"><i>Massif planté déposé</i></p> <p>Panneaux d'interprétation</p> <ul style="list-style-type: none"> L'entreprise a proposé des exemples de panneaux pour validation auprès du syndicat. <p>Accès à la rive gauche (amont du pont de la rue Fostier Bayard)</p> <ul style="list-style-type: none"> L'entreprise mettra en œuvre des matériaux (GNT + stabilisé) afin de réaliser la réfection de l'accès au cours d'eau.  <p style="text-align: center;"><i>Accès au cours d'eau à remettre en état</i></p>	ID VERDE	Semaine 49
			Union des Syndicats	Semaine 48
			ID VERDE	Semaine 48
D	Délais et planning	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place des dispositifs d'éclairage semaine 49 		

Le maître d'œuvre

Le 24 Novembre 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
