

Désembâclement des cours d'eau 2022-2025

Syndicat du Bassin Versant du Petit Morin Amont

N° Projet :
MVSR.140

Date : 17/04/2023

Numéro : 02

Lieu : 51 communes (Marne,
Aisne, Seine-et-Marne)

EQUIPE PROJET

MVS RENARTURATION

Superviseur	Mathieu LASVAUX	06.84.84.72.68	ml-mvs@renaturation.fr
Chargé de travaux	Augustin MARET	06.48.72.13.51	am-mvs@renaturation.fr
Chef d'équipe	Augustin TROUILLE	06.73.36.38.79	at-mvs@renaturation.fr
Ouvrier du Génie Ecologique	Robin VANDENBEMDEN	07.88.47.35.02	rv-mvs@renaturation.fr
Ouvrier du Génie Ecologique	Julien GASTRIN	07.86.89.12.20	jg-mvs@renaturation.fr
Ouvrier du Génie Ecologique	Baptiste FACON	06.74.63.31.26	bf-mvs@renaturation.fr

OPERATIONS REALISEES

DESEMBACLEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Démarrage des opérations sur site le mercredi 5 avril 2023 au niveau de l'embâcle n°23 sur la commune de Talus-Saint-Prix Gestion des embâcles de l'amont vers l'aval Quantité prévisionnelle : 72 embâcles géoréférencés comme suit https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WMyJZkerCqeL-OYCQBURLdC9DQDizo&usp=sharing Durée prévisionnelle : 4 semaines
Avancement S15	<ul style="list-style-type: none"> 05/04/2023 : 9 embâcles gérés dont 6 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval) 06/04/2023 : 11 embâcles gérés dont 4 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval) et 1 supplémentaire (37 bis) en remplacement du 33 bis non retrouvé 07/04/2023 : 12 embâcles gérés dont 1 non retrouvé et remplacé (moins de 100 m vers l'aval) 11/04/2023 : 10 embâcles gérés dont 2 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval) 12/04/2023 : 8 embâcles gérés dont 2 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval) 13/04/2023 : 9 embâcles gérés dont 2 non retrouvés non remplacés, 1 remplacé (moins de 100 m vers l'aval) et 1 supplémentaire (68 bis) 14/04/2023 : 3 embâcles gérés dont 1 non retrouvé et remplacé (moins de 100 m vers l'aval) <ul style="list-style-type: none"> Points investigués depuis le démarrage des opérations : 68 sur 76 soit 89% Gestion manuelle au 14/04/2023 : 59 sur 61 unités Gestion mécanique au 14/04/2023 : 1 sur 7 unités
Autre	<ul style="list-style-type: none"> Visite de site d'Alain MOROY le 12/04/2023 Visite de site de Jonathan LARGET et de Monsieur ROCHE le 13/04/2023

SUIVI	
Environnemental	<ul style="list-style-type: none"> Kit antipollution à disposition des équipes opérationnelles Stockage des produits de coupes à 10 m du haut de berge Présence de salamandre au droit du secteur ru de Champramont Rivière Petit Morin en crue du 12/04 midi au 14/04 fin de journée
Technique	<ul style="list-style-type: none"> Présentation technique du projet aux équipes opérationnelles : 05/04/2023 Courrier d'information aux riverains transmis le 04/04/2023 aux mairies concernées A mécaniser : Embâcle n°8 (8 unités concernées vs 1 unité dans le BC n°1), Embâcle n°11, Embâcle n°18, Embâcle n°40 (2 unités), Embâcle 69 complément
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Accueil sécurité du personnel : présentation du PDP le 04/04/2023 Accident : sans objet

PLANNING			
Durée prévisionnelle des opérations	4 semaines	Retard (Non / Oui) :	Non
Avancement au 14/04/2023	2 semaines	Si oui indiquer la raison	OS1 reçu le 30/03/2023 – délai de livraison : 3 mois
Prévisionnel	Poursuite des opérations en S16		

FAITS MARQUANTS	
Nature (si arrêt de chantier indiquer la durée)	<ul style="list-style-type: none"> Observation de 2 embâcles supplémentaires (n°69 et n°70) en présence de M. LARGET passant le nombre d'embâcle à gérer à 74 (76 dont 2 non retrouvés non remplacés). Proposition de 15 embâcles supplémentaires sur le Petit Morin (dont 7 à proximité de l'embâcle 8) et 12 sur le ru de Champramont à proximité de la confluence avec le Petit Morin (cf. photos et localisation en pj)

EFFECTIFS				
Personnel	Poste	Société	Date	Heures
Augustin TROUILLE	Chef d'équipe	MVS Renaturation	11/04 au 14/04/2023	44 H
Julien GASTRIN	OGE	MVS Renaturation	11/04, 12/04 et 14/04/2023	33 H
Baptiste FACON	OGE	MVS Renaturation	13/04/2023	11 H

ENGINS ET EQUIPEMENTS			
Matériel	Société	Heure / Equipement	Quantité
SANDERO STEPWAY	MVS Renaturation	44H	1
TREUIL PORTATIF	MVS Renaturation	44H	1
TRONCONNEUSES	MVS Renaturation	44H	2
BATEAU FOND PLAT	MVS Renaturation	44H	1

EMBACLES GERES AU 14/04/2023

Date d'intervention	Géolocalisation	Cours d'eau	Commune	N° Embâcle
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	1
12/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Montmirail	2
12/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Montmirail	3
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	4
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	5
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	6
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	7
12/04/23	Prise de connaissance des accès - 8 embâcles à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail	8
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	9
13/04/23	ok - reste souche sous eau	Petit Morin	Montmirail	10
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	40
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	40
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	11
13/04/23	non retrouvé	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	12
13/04/23	non retrouvé	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	13
13/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	14
14/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	15
14/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	16

14/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Dhuys-et-Morin-en-Brie	17
14/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	Petit Morin	Vendières	18
		Petit Morin	Vendières	19
		Petit Morin	Vendières	20
		Petit Morin	Vendières	21
		Petit Morin	Vendières	22
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	23
05/04/23	ok	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	24
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	25
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	26
05/04/23	ok	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	27
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Corfélix	38
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Corfélix	28
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Corfélix	29
05/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Troisnay	30
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Troisnay	31
06/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Troisnay	39
06/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Troisnay	32
06/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Troisnay	33
06/04/23	absence au point GPS	Petit Morin	Le Thoult-Troisnay	33

06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	34
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	35
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	36
06/04/23	ok mais 2 unités gérées à moins de 100 m	Petit Morin	Boissy-le-repos	37
06/04/23	ok	Petit Morin	Boissy-le-repos	68
13/04/23	ok	Petit Morin	Boissy-le-repos	68 bis
		Petit Morin	Montmirail / Mécringes	69 complément
		Petit Morin	Montmirail / Mécringes	70 complément
07/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	41
06/04/23	ok mais désembâblement sur 15 ml - ru sec à désembâcler sur plusieurs dizaines de mètres	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	42
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	43
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	44
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	45
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	46
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	47
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	48
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	49
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	50

07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	51
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	52
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	53
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	54
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	55
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	56
11/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	57
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	58
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	59
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	60
11/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	61
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	62
11/04/23	ok	Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	63
		Ru de Champramont	Boissy-le-Repos	63
13/04/23	ok	Ru du Val	Epine-aux-Bois	64
13/04/23	ok	Ru du Val	Epine-aux-Bois	65
13/04/23	ok	Ru du Val	Epine-aux-Bois	66
13/04/23	ok	Ru du Val	Epine-aux-Bois	67

PHOTOGRAPHIES



Photo 1 : Avant/Après Embâcle 59 (Source MVS Renaturation)



Photo 2 : Avant/Après Embâcle 60 (Source MVS Renaturation)

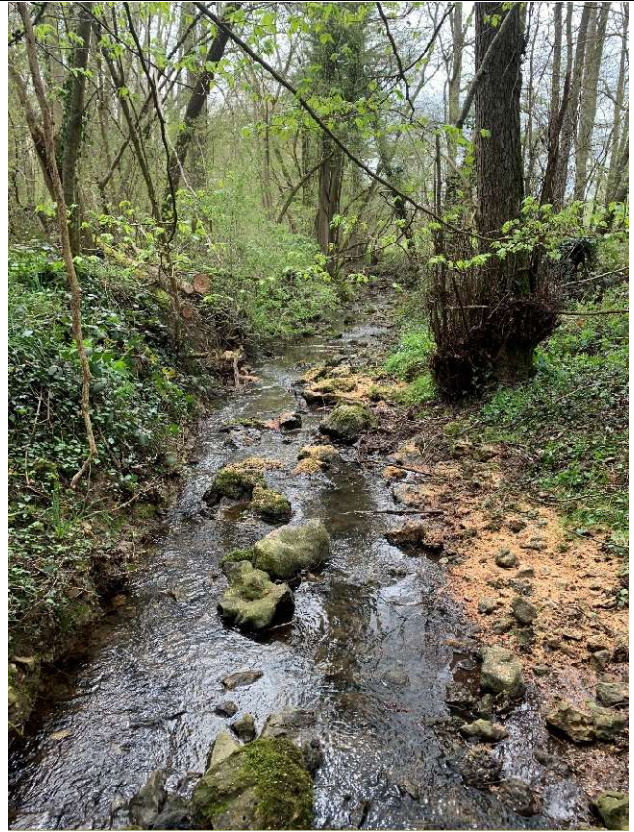


Photo 3 : Avant/Après Embâcle 61 remplacé (Source MVS Renaturation)



Photo 4 : Avant/Après Embâcle 1 (Source MVS Renaturation)



Photo 5 : Avant/Après Embâcle 4 (Source MVS Renaturation)



Photo 6 : Avant/Après Embâcle 7 (Source MVS Renaturation)



Photo 7 : Avant/Après Embâcle 66 (Source MVS Renaturation)

Dossier photos transmis par we transfer.
