



SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
DE L'OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS

Travaux du programme pluriannuel d'entretien de l'Oise et de ses différents bras

Tranche 4

Compte-rendu de la réunion de chantier 23 juin 2016

Lieu :	Pont de l'Oise, Châtillon-sur-Oise à 09h30
---------------	--

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Ets MASCITTI Nino

Nom, Prénom:	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
DUFOUR Patrick	Président du syndicat	✓		
AUBRY Vincent	Union des syndicats	✓		
MASCITTI Dominique	ETS MASCITTI NINO SA	✓		
LENTE Michel	Commune de Chatillon-sur-Oise	✓		
DUNTZE MARTIN	FPPMA 02	✓		
BARBIER Mickael	Chef d'équipe ETS MASCITTI SA	✓		
WOJCIECHOWSKI Bernard	Commune de Chatillon-sur-Oise			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
ANDRE Marjorie	Entente Oise Aisne			✓


- Cette réunion concerne les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras (tranche 4). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras se poursuivent.
- L'entreprise se situe actuellement au début du bras de la rivière Oise dite « rivière neuve » sur le tronçon OMAV (commune de Séry-les-Mézières).
- L'entreprise poursuivra les travaux d'entretien sur le tronçon OMT si le niveau d'eau diminue.



Localisation de l'entreprise MASCITTI

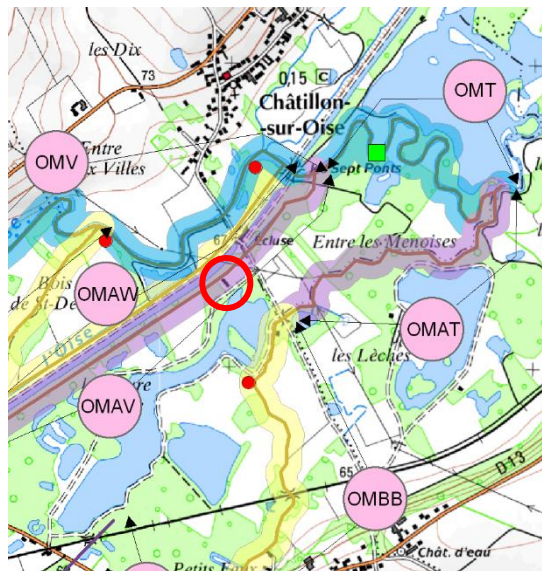

DETAIL DES TRAVAUX :

- Une partie de l'entretien a été réalisé sur le tronçon OMT mais vu les conditions climatiques le niveau d'eau est trop haut pour réaliser une bonne coupe de la ripisylve.
- L'entreprise doit réaliser un aménagement de berge en technique végétale sur le tronçon OMT. L'aménagement est un peigne qui permettra de remettre en état la berge et de recréer des habitats aquatiques pour la faune locale.
- Une fascine de saule sera aménagée en aval du point de l'Oise à Séry-les-Mézières. Celui-ci aura pour but de protéger la berge rive droite qui subit de forte érosion en période hivernale et de crue
- Concernant les travaux de retrait des gros peupliers en bordure de rivière, l'entreprise MASCITTI SA doit abattre 14 peupliers sur la commune de Chatillon-sur-Oise. Les prochains marquages de peupliers seront piquetés lors des réunions suivantes.
- Les ouvriers ont veillés à conserver un rideau végétatif entre le haut de berge et la piste. Ce rideau permet notamment de maintenir une transition entre le milieu aquatique et terrestre. De plus, la conservation de ligneux en bordure de rivière limite le phénomène d'érosion et conserve des habitats naturels favorables à la faune locale.



Embâcle problématique sur le tronçon OMT



Arbre fortement penchant sur le tronçon OMT

- Les branches basses ne gênant pas l'écoulement de l'eau sont laissées en place. Ceci permet de diversifier les habitats et de protéger également la berge.

- Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et les espèces présentes en bordure de rivière.

REMARQUES ET OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Afin d'améliorer les relations et de faciliter l'évacuation des bois sur chaque parcelle, il est demandé aux propriétaires concernés par la récupération de bois sur des parcelles voisines, de se mettre en relation avec son voisin concerné et de l'informer de la période de retrait des bois de sa parcelle. Un marquage des grumes arbres sera réalisé par l'entreprise afin de connaître leurs provenances (rive gauche ou droite)
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat 03.23.08.25.22
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43
 - M. Vincent AUBRY – Union des syndicats 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu le **jeudi 30 juin 2016 à 9h30** au pont de l'Oise à Châtillon-sur-Oise.

Le service technique,

