



Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ru de Retz et de ses  
affluents

## Travaux d'entretien du ru de Retz

### TRANCHE TRANSITOIRE

#### Compte-rendu de la réunion de piquetage 20 juillet 2016

<b>Lieu :</b>	Devant la mairie de Laversine à 14h30
---------------	---------------------------------------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ru de Retz et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	FORETS ET PAYSAGES

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
BIARD Daniel	Président du syndicat			✓
AUBRY Vincent	Union des syndicats	✓		
BESSEREAU Michel	Commune de Laversine	✓		
LANGRAND Pierre	Commune d'Ambleny	✓		
POURTEYRON Jean-Pierre	Commune de Laversine	✓		
LAURENT Sebastian	Entreprise FORETS ET PAYSAGES	✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓
LEBRETON Thomas	Entente Oise Aisne			✓

- Cette réunion concerne le piquetage des travaux d'entretien du ru de Retz (tranche transitoire). Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT).

## SITUATION ACTUELLE :



- Cette tranche de travaux concerne l'entretien du lit du ru de Retz sur des secteurs complètement encombrés et l'effacement d'un seuil dans la commune d'Ambleny ce qui représente un linéaire d'environ 1,8 km cumulé. Les travaux sont répartis en petit tronçon de 30 à 300 mètres sur tout le linéaire.
- Les tronçons prévus en entretien relèvent d'un caractère d'urgence dû aux problématiques d'écoulement et de continuité que les embâcles peuvent engendrer dans les zones urbanisées ou à proximité d'infrastructures.
- L'entretien s'effectue sur les communes de : Ambleny, Coeuvres-et-Valsery, Laversine, St Bandry et Soucy. Ces travaux ont été répartis en 10 tronçons de travaux.
- Les travaux vont débuter le lundi 25 juillet 2016 par l'entretien du tronçon RETZ 7 commune de Laversine.



Embâcles sur le tronçon Retz 7 (commune Laversine)

## DETAIL DES TRAVAUX :

- **L'entretien du lit**, passe par le retrait des embâcles gênants le bon écoulement de l'eau. Il est rappelé le principe de gestion des embâcles :
  - les embâcles sont systématiquement enlevés quand ils se trouvent dans ou à proximité d'un secteur à enjeux face aux risques inondations (zone urbaine, ouvrage...),
  - les déchets d'origine anthropique se trouvant dans les embâcles seront récupérés et évacués hors du site par l'entreprise.

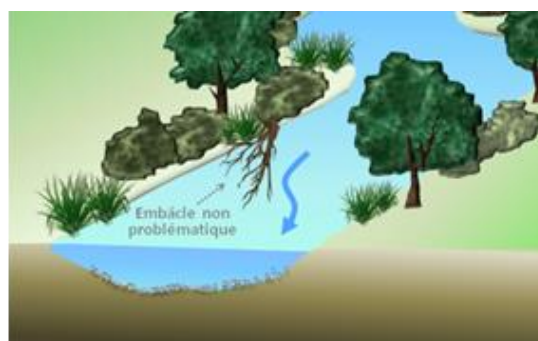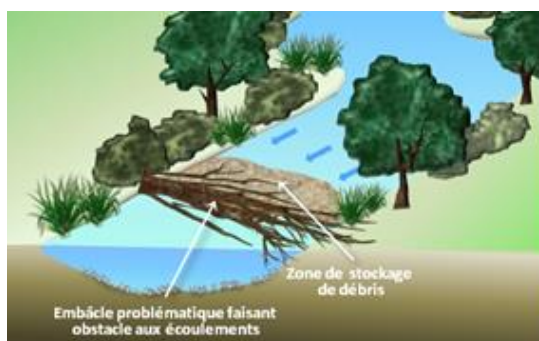

Les schémas ci-dessus permettent de comprendre la différence entre un embâcle problématique et non-problématique

- Les résidus de coupe seront placés en andain en retrait (mini 1,5 mètres) du haut de berge sur l'ensemble des travaux.

- L'entretien sera réalisé manuellement sur tous les secteurs.
- Sur l'ensemble des tronçons, les travaux se dérouleront de l'amont vers l'aval afin de **recupérer les résidus ligneux et de coupes**, avec un dispositif adapté (filet ou embâcles en aval), qui seraient emportés par le cours d'eau.

#### REMARQUES, OBSERVATIONS :

- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien du ru de Retz, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :

M. Vincent AUBRY – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74

#### LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu le **Mercredi 27 juillet 2016 à 9h30** devant la mairie de LAVERSINE.

Le service technique,

