



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**
Service technique

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
DE L'OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS**

Travaux du programme pluriannuel d'entretien de l'Oise et de ses différents bras

Tranche 4

Compte-rendu de la réunion de chantier 21 juillet 2016

Lieu :	Pont de l'Oise, Mézières-sur-Oise à 09h30
---------------	---

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Ets MASCITTI Nino

Nom, Prénom:	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
DUFOUR Patrick	Président du syndicat			✓
AUBRY Vincent	Union des syndicats	✓		
MASCITTI Dominique	ETS MASCITTI NINO SA			✓
BRUGNEAUX Joël	Commune de Berthenicourt	✓		
PIOT Regis	Commune de Berthenicourt	✓		
BARBIER Mickael	Chef d'équipe ETS MASCITTI SA	✓		
WOJCIECHOWSKI Bernard	Commune de Chatillon-sur-Oise	✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
LEBRETON Thomas	Entente Oise Aisne			✓


- Cette réunion concerne les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras (tranche 4). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras seront à l'arrêt à partir du lundi 25 juillet.
- L'entreprise se situe actuellement en aval de la route entre Berthenicourt et Senercy sur le tronçon OMBL.
- L'entreprise poursuivra les travaux d'entretien sur le tronçon OMBL jusqu'à vendredi.



Localisation de l'entreprise MASCITTI

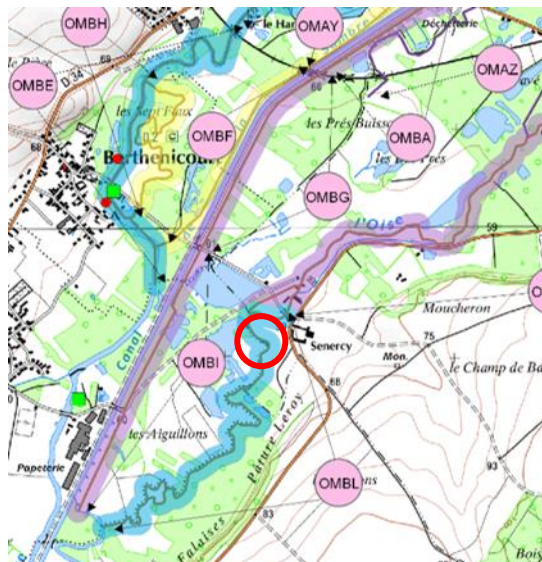

DETAIL DES TRAVAUX :

- L'entretien est terminé sur les tronçons OMT, OMV, OMW, OMBE, OMBA et OMAV. Cela représente un linéaire de 9 000 mètres de cours d'eau entretenu.
- Sur le tronçon OMBL l'entreprise effectue les travaux d'entretien depuis le lit de la rivière. Des barrages filtrants sont mis en place ponctuellement afin de retenir les résidus de coupes.
- L'entreprise intervient en même temps, à l'aide d'une deuxième pelle mécanique, sur le retrait des embâcles problématiques. Le retrait de ces encombres était nécessaire et a permis de réduire l'érosion des berges et la sédimentation des fonds. Ainsi, le retrait a permis une baisse du niveau d'eau et la diversification des écoulements (décolmatage des fonds du lit).
- L'entretien du contre-fossé (tronçon OMBA) est réalisé manuellement par une équipe de bûcheron. L'encombrement du lit et la ripisylve non vieillissant ne nécessitent pas l'intervention de la pelle mécanique.
- Le tronçon OMBG sera lui aussi réalisé manuellement.



Bras de l'Oise avant l'entretien



Bras de l'Oise après entretien

- Une intervention sur les berges dans l'usine TEREOS est prévue pour la première semaine d'août. Elle concerne l'abattage des peupliers en bordure de rivière.
- Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et les espèces présentes en bordure de rivière.
- Les consignes du maître d'ouvrage, basées sur le retrait de la végétation encombrante et sur la sélection végétative des ligneux, ont été correctement appliquées. Le ruisseau a ainsi retrouvé un bon écoulement et une dynamique intéressante via les embâcles naturels conservés (souches, branches ...)

REMARQUES ET OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat 03.23.08.25.22
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43
 - M. Vincent AUBRY – Union des syndicats 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier sera prévue lors **de la reprise du chantier**.

Le service technique,

