Maîtrise d'œuvre partielle relative à la restauration de la continuité écologique au niveau du seuil de l'ancien moulin de Caranda à Cierges

COMPTE RENDU N°2
Réunion de suivi du chantier

Maître d'Ouvrage :	Syndicat du Bassin Versant de l'Ourcq amont et du Clignon
Objet :	Réunion de suivi du chantier
Lieu de réunion :	Ancien Moulin de Caranda
Date réunion :	Mercredi 15 septembre 2021 – 11H00

Date de rédaction : Vendredi 17 septembre 2021
Rédacteur : Arnaud FLIPPE
N/Réf. : E190912/CR2
Version : 1

Nombre de pages : 4

Liste des présents :

Prénom NOM	Organisme	Fonction
Jonathan LARGET	*Union des Syndicats*	*Responsable milieux aquatiques*
Gérard BETHGNIES	*Commune de Cierges*	*Propriétaire*
Yves LEVEQUE	*Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon*	*Président*
Roger PIOT		*Propriétaire de l'habitation*
Christian PETIT		*Propriétaire de l'habitation*
Michel GANDON	*Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon*	*Vice-Président*
Manuel MARQUES	*Entreprise MASCITTI*	*Conducteur de Travaux*
Christian COZILIS	*CE3E*	*Directeur maître d'œuvre*
Arnaud FLIPPE	*CE3E*	*Chargé de projet*

I. Objet de la réunion

L'objet de la réunion est de suivre le chantier.

II. Contenu de la réunion

Terrassement du nouveau lit

Suite à la validation du piquetage lors de la dernière réunion (hors linéaire encadrant le pont aval), l'entreprise a commencé à terrasser le fond de forme du nouveau lit. Les extrémités aval du nouveau lit seront réalisées en dernier avant de travailler autant que possible hors d'eau.

L’entreprise a réalisé un tronçon de la section 1. CE3E valide ce tronçon où les blocs sont agencés entre eux et non bennés. Le géotextile coco est bien ancré :

- en pied de berge sous les matériaux pierreux du lit ;
- en crête de berge avec la réalisation d’une bèche puis un recouvrement en terre végétale.

Le mélange grainier spécial berge est semé avant la pose du géotextile coco et un semi final sera réalisé au-dessus du géotextile coco.

Vue de l’amont du nouveau lit

Zoom sur le tronçon réalisé

Sur les berges présentant des terres de mauvaise qualité, il est demandé à l’entreprise de napper les berges d’une couche de terre végétale issue des terrassements afin d’optimiser la reprise du semi.

La zone entre les deux ponts a été terrassée sur les 3/4 amont. Le talus de la berge rive gauche en intrados sera à adoucir en pente 2 à 3/1.

Vue du terrassement du linéaire entre les deux ponts

Pont aval

L'implantation du pont aval a été adaptée pour s'éloigner des parcelles habitées. Le plan de masse ci-dessous présente le nouveau tracé sur ce secteur.

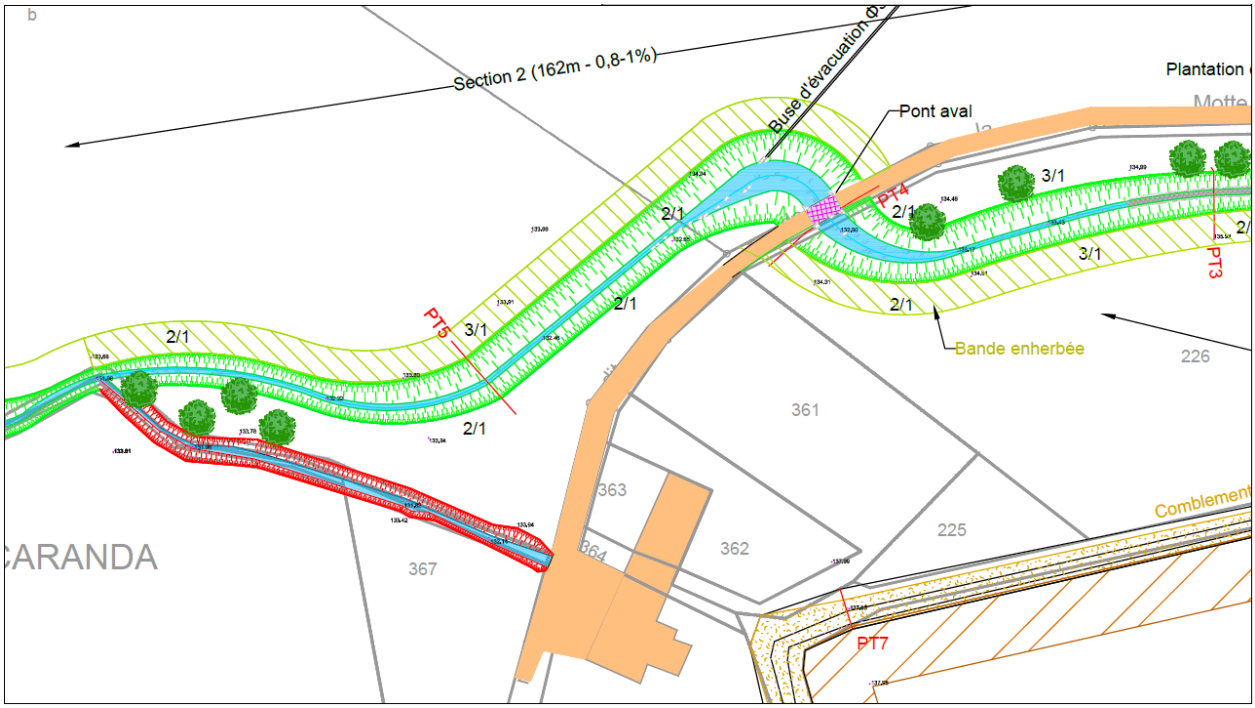

Plan de masse du nouveau tracé en plan au droit du pont aval

III. Points à valider et suites données

L'entreprise prévoit de continuer la réalisation du nouveau lit semaines 37-38.

L'entreprise transmettra des photos d'avancement journalier du chantier et peut communiquer ou rendre compte de toute difficulté rencontrée ou demande d'arbitrage au MOE CE3E par SMS pour une réponse immédiate au 06 37 90 81 46.

La prochaine réunion de chantier aura lieu le **mardi 21 septembre 2021 à 14H00** sur le site des travaux à Cierges.

IV. Liste de diffusion

Prénom NOM	Organisme	Mail
Jonathan LARGET	*Union des Syndicats*	j.larget@griv.fr
Wilfried KOUEVI	*Union des Syndicats*	w.kouevi@griv.fr
Laetitia CAQUARD	*Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon*	sigbv-ourcq-amont@orange.fr
Yves LEVEQUE	*Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon*	y.leveque02@gmail.com
Jacques BOYOT	*Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon*	beatrice.boyot@gmail.com
Gérard TROMBETTA	*Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon*	mairie.silly@orange.fr
Étienne HAY	*CARCT*	mairie@epaux-bezu.fr
Wejdene HASNAOUI	*CARCT*	wejdene.hasnaoui@carct.fr
Fabrice CAPY	*Agence de l'eau Seine Normandie*	capy.fabrice@aesn.fr
Maryse IVANOFF	*Agence de l'eau Seine Normandie*	ivanoff.maryse@aesn.fr
Anne SIRON	*FEDER*	anne.siron@hautsdefrance.fr
Jean-François ALAVOINE	*OFB*	dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr
Anne-France LELIEVRE	*DDT02*	anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr ddt-env@aisne.gouv.fr
Martin DUNTZE	*Fédération de pêche de l'Aisne*	mduntze@peche02.fr
Romain MARLOT	*Fédération de pêche de l'Aisne*	rmarlot@peche02.fr
David FIRMIN	*CEN Hauts-de-France*	d.frimin@cen-hautsdefrance.org
Jean-Marie BERECHE	*Maire commune de Cierges*	mairiecierges02@orange.fr
Jérémy DUSSAUSSOY	*Exploitant agricole*	sandradussaussoy@gmail.com
Roger PIOT	*Propriétaire de l'habitation*	roger.piot@aliceadsl.fr
Christian PETIT	*Propriétaire de l'habitation*	oursourcq@bbox.fr
Sylvain VERDOOLAEGHE	*Exploitant agricole*	sylvain.verdoolaeghe@orange.fr
Claire ALATEINTE	*Chambre d'agriculture de l'Aisne*	claire.alateinte@ma02.org
Michel GANDON	*Propriétaire*	gandonmichel02@gmail.com
Manuel MARQUES	*MASCITTI*	sa.mascitti@wanadoo.fr
Christian COZILIS	*CE3E*	christian.cozilis@ce3e.fr
Arnaud FLIPPE	*CE3E*	arnaud.flippe@ce3e.fr
