Maître d'œuvre	Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques et de valorisation du Ru des Anorelles dans le centre-bourg d'Anor (59) Syndicat Intercommunal de Gestion du Bassin Versant de l'Oise Amont/ Commune d'Anor	Compte rendu de chantier RC 15

COMPTE RENDU

Réunion de chantier du 10/09/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent, E : Excusé

Structure		*Nom et init. prénom*	*Tél.*	*Fax*	*Adresse courriel*	*Etat*	*Diffusion à*
MO	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.			raymond.predhomme@laposte.net	E	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	
		HUTIN P.			philippe.hutin@wanadoo.fr	A	
		DUDIN J.			syndic.siaboa@akeonet.com	P	
MO	Commune d'ANOR	PERAT J-L.			contact-mairie@anor.fr	A	x
		BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	x
		PECQUERIE S.			samuel.pecquerie@ville-anor.fr	P	x
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48			A	x
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65		regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12		guillaume.koestel@anteagroup.com	P	x
E	Ent. IDVERDE	BRUYERRE C.	06.76.86.68.43		christophe.bruyerre4@orange.fr	P	x
		RICQUE L.	06.76.12.83.29		laurent.ricque@idverde.com	A	
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14		geoffrey.vandaele@idverde.com	A	x
E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76		laurent.ratte@colas-np.com	A	x
E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31		wattelec2@wanadoo.fr	A	x
AMO	USAGMA	FAUVEL M.	03.23.20.36.74		union-des-syndicats@griv.fr	P	x
		FELZINGER G.				A	
		PACAUD G.				A	
	Commission tvx	FRAILLON M.			fraillon.gm@orange.fr	A	x
		GUILLAUME P.				A	x
	DDTM						
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.			J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	A	x
	CG59	LEDDA C.			carole.ledda@cg59.fr	A	x
		LEMAIRE B.				A	x
	Voirie Départementale	FOUQUART G.			gerard.fouquart@cg59.fr	A	x
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.			houdayer.eptboise@orange.fr	A	x
	Feder. Pêche 59	KLEINPRINTZ G.			gildas@peche59.com	A	X
		PETIT E.				A	x
	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81		s.paye@noreade.fr	P	x

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
- Caissons végétalisés, banquettes végétalisées.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
-

Pièce(s) annexe(s)
-

Prochaine réunion

Non définie à ce stade.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
- Finition de la pose des nattes végétalisées sur l'ensemble du linéaire aménagé semaine 38.
- Reprise des enrochements (en sortie de canalisation) et du lit mineur (au droit de la passerelle d'accès au parc Despret) semaine 38.
- Plantation des plançons de saule au sein des caissons semaine 39.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
- Réception des premiers matériaux pour la réalisation des ouvrages bois semaine 38.

NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	**Points abordés**	**Observations**	**Action par**	**Date d'action**
1	***Documents remis / à remettre***	**Documents remis en réunion** - **Documents à remettre** -		
2	***Remarque(s) sur le précédent compte-rendu***	-	-	-
3	***Travaux***	**<u>Aménagements en aval du pont de la D156</u>** ▪ L'ensemencement des banquettes a été réalisé. ▪ Un géotextile coco a été mis en place sur le talus en rive gauche afin d'en renforcer la stabilité. ▪ Un ensemencement du talus a été réalisé. ▪ Le front amont du géotextile coco, en pied de talus, sera renforcé. *Talus (rive gauche) recouvert de géotextile et ensemencé* *Front amont du géotextile, en pied de talus, à renforcer*	ID VERDE	Semaine 38

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	**Points abordés**	**Observations**	**Action par**	**Date d'action**
3	***Travaux***	**<u>Caissons végétalisés en amont du pont de la rue Fostier Bayard (caissons amont)</u>** ▪ Le regard descellé a été remis en état. *Regard rescellé* ▪ Les espaces inter-blocs des épis en enrochement (**<u>amont et aval</u>**) seront comblés au droit des transitions entre les blocs et les caissons végétalisés. ▪ La largeur de la banquette située au pied des caissons pourra être diminuée d'environ 50cm et les matériaux réutilisés pour le comblement des espaces inter-blocs. 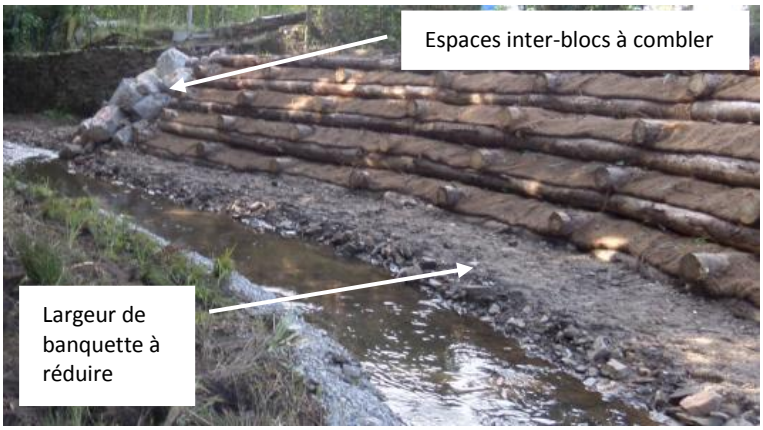 *Caissons amont et épi en enrochements amont* **<u>Caissons végétalisés en amont du pont de la rue Fostier Bayard (caissons aval)</u>** ▪ Les caissons végétalisés ont été finalisés courant de semaine 37. *Caissons aval et épi en enrochements amont*	ID VERDE	Semaine 38

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	**Points abordés**	**Observations**	**Action par**	**Date d'action**
3	***Travaux***	**<u>Banquettes végétalisées et lit d'étiage en amont du pont de la rue Fostier Bayard</u>** ▪ La pose des nattes végétalisées a été finalisée courant de semaine 37. 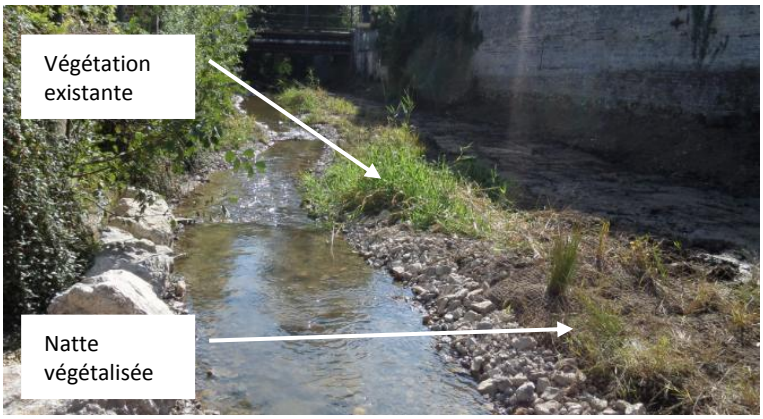 *Nattes végétalisées en amont du pont de la rue Fostier Bayard* ▪ En accord avec la commune, des enrochements ont été mis en place au droit de l'ancien accès au cours d'eau. ▪ La rampe d'accès sera remise en état par apport de stabilisé. ▪ La sortie de la canalisation située en aval des caissons aval a été habillée par la mise en place d'enrochements. ▪ En aval direct du linéaire de caisson aval, au droit de l'accès au cours d'eau, la banquette a uniquement été constituée de graves. ▪ Le muret situé en rive gauche a été protégé par la mise en place d'enrochements. 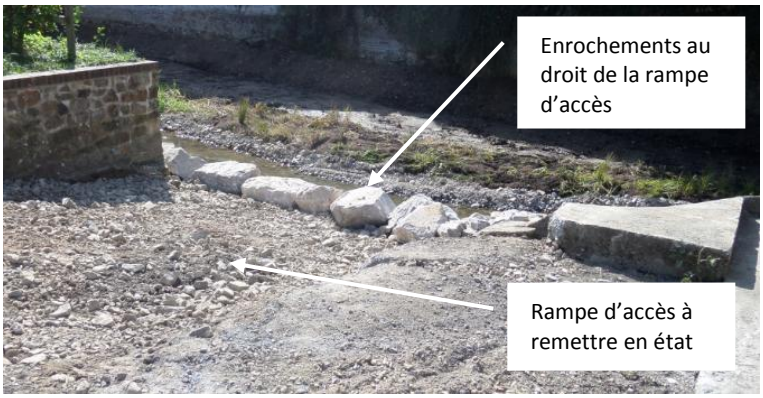 *Enrochements mis en place au droit de l'ancien accès au cours d'eau* *Enrochements mis en place en sortie de canalisation*	ID VERDE ID VERDE	Semaine 39 Semaine 38

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	**Points abordés**	**Observations**	**Action par**	**Date d'action**
3	***Travaux***	*Protection du muret existant par enrochements* ▪ Plusieurs canalisations sont présentes en rive droite, le long de la banquette conservée. ▪ 3 canalisations sont encore fonctionnelles : o 2 canalisations collectant les eaux de toiture. o 1 canalisation d'eau usée. ▪ Les sorties des 3 canalisations fonctionnelles seront renforcées (sur environ 1m²) par la mise en place d'empierrements de type 0-100mm. ▪ Afin de limiter autant que possible l'érosion des banquettes, les 2 canalisations collectant les eaux de toitures devront être abaissées (à la charge des riverains). *Canalisations collectant les eaux de toiture à abaisser* *Sortie de canalisation d'eaux usées à protéger par empierrements*	ID VERDE	Semaine 38

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	**Points abordés**	**Observations**	**Action par**	**Date d'action**
3	***Travaux***	**<u>Caissons végétalisés</u>** ▪ Des ramilles de saule ont été « piquées » sur 5cm à 10cm de profondeur, au sein des caissons végétalisés situés le plus en aval. ▪ Les dimensions des ramilles ainsi que la profondeur de plantation au sein des caissons ne seront a priori pas suffisants pour assurer une bonne reprise des végétaux. ▪ Des plançons de saule seront piqués sur **<u>la totalité du linéaire</u>** de caissons végétalisés réalisée. *Ramilles mises en place au sein du caisson situé le plus en aval* **<u>Banquettes végétalisées en amont du pont de la D156</u>** ▪ La reprise des enrochements en sortie des canalisations est en cours de réalisation. ▪ Les dernières surfaces de nattes végétalisées seront posées fin de semaine 38. ▪ L'entreprise veillera à reprendre le lit mineur (en rive droite) au droit de la passerelle d'accès au parc Despret (**cf. CR 11**). ▪ La banquette située au droit du futur ponton d'observation (en bas de berge) sera légèrement reprise. *Banquette à reprendre*	ID VERDE ID VERDE	Semaine 39 Semaine 38

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	**Points abordés**	**Observations**	**Action par**	**Date d'action**
4	***Délais et planning***	▪ Finition de la pose des nattes végétalisées sur l'ensemble du linéaire aménagé semaine 38. ▪ Reprise des enrochements (en sortie de canalisation) et du lit mineur (au droit de la passerelle d'accès au parc Despret) semaine 38. ▪ Plantation des plançons de saule au sein des caissons semaine 39.		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	**Points abordés**	**Observations**	**Action par**	**Date d'action**
A	***Documents remis / à remettre***	**Documents remis en réunion** - **Documents à remettre** ▪ Planning prévisionnel	ID VERDE	Semaine 38
B	***Remarque(s) sur le précédent compte-rendu***	**-**	-	-
C	***Travaux***	-		
D	***Délais et planning***	▪ Réception des premiers matériaux pour la réalisation des ouvrages bois semaine 38.		

Le maître d'œuvre

Le 14 Septembre 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
