



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**
Service technique

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
DE L'OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS**

Travaux du programme pluriannuel d'entretien de l'Oise et de ses différents bras

Tranche 4

Compte-rendu de la réunion de chantier 30 juin 2016

Lieu :	Pont de l'Oise, Châtillon-sur-Oise à 09h30
---------------	--


Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Ets MASCITTI Nino

Nom, Prénom:	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
DUFOUR Patrick	Président du syndicat	✓		
AUBRY Vincent	Union des syndicats	✓		
MASCITTI Dominique	ETS MASCITTI NINO SA	✓		
LENTE Michel	Commune de Chatillon-sur-Oise	✓		
BARBIER Mickael	Chef d'équipe ETS MASCITTI SA	✓		
WOJCIECHOWSKI Bernard	Commune de Chatillon-sur-Oise	✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
LEBRETON Thomas	Entente Oise Aisne			✓

- Cette réunion concerne les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras (tranche 4). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras se poursuivent.
- L'entreprise se situe actuellement au début du bras de la rivière Oise dite « rivière neuve » sur le tronçon OMV (commune de Mézières-sur-Oise).
- L'entreprise poursuivra les travaux d'entretien sur le tronçon OMAV si le niveau d'eau augmente.

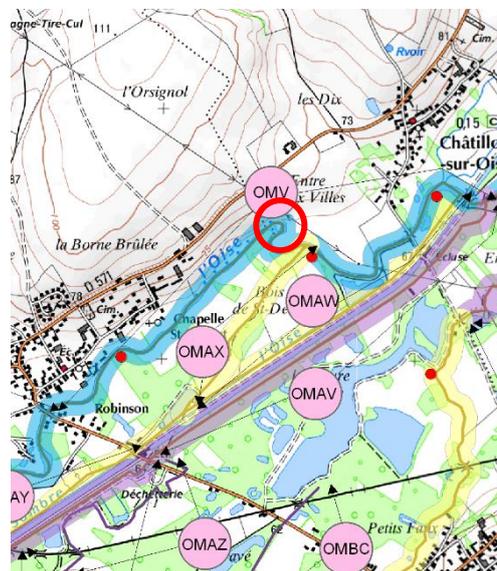

 Localisation de l'entreprise MASCITTI

DETAIL DES TRAVAUX :

- L'entretien est terminé sur le tronçon OMT. La coupe des peupliers sur ce tronçon est en cours (2 peupliers à ébrancher).
- Le début du tronçon OMV sur la commune de Chatillon-sur-Oise était fermé, l'entreprise a rouvert la rivière sur une largeur d'au moins 6 mètres.
- L'entreprise a commencé le stockage des matériaux (résidus de coupe d'arbres) pour la confection du peigne sur le tronçon OMT.
- Concernant les travaux de retrait des gros peupliers en bordure de rivière, l'entreprise MASCITTI SA a coupé 17 peupliers sur la commune de Chatillon-sur-Oise. Les prochains marquages de peupliers seront réalisés lors des réunions suivantes.
- L'érosion de berge est importante sur l'Oise et on trouve de nombreux arbres/cépées minés en pied. L'entreprise a soulagé les souches en retirant du poids afin d'éviter le risque de basculement de l'arbre dans le cours d'eau.



Tronçon OMV après entretien



Abattage de peuplier tronçon OMT

- Les branches basses ne gênant pas l'écoulement de l'eau sont laissées en place. Ceci permet de diversifier les habitats et de protéger également la berge.
- Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et les espèces présentes en bordure de rivière.

- M. PARENT propriétaire sur la commune de Mézières-sur-Oise n'est pas disposé à laisser l'entreprise couper les peupliers en bordure immédiate du cours d'eau. Il est donc demandé à l'entreprise de ne couper les 5 peupliers.

REMARQUES ET OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Afin d'améliorer les relations et de faciliter l'évacuation des bois sur chaque parcelle, il est demandé aux propriétaires concernés par la récupération de bois sur des parcelles voisines, de se mettre en relation avec son voisin concerné et de l'informer de la période de retrait des bois de sa parcelle. Un marquage des grumes arbres sera réalisé par l'entreprise afin de connaître leurs provenances (rive gauche ou droite)
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat 03.23.08.25.22
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43
 - M. Vincent AUBRY – Union des syndicats 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu le **jeudi 7 juillet 2016 à 9h30** au pont de l'Oise à Mézières-sur-Oise.

Le service technique,

