



Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ru de Retz et de ses
affluents

Travaux d'entretien du ru de Retz

TRANCHE TRANSITOIRE

Compte-rendu de la réunion de chantier 27 juillet 2016

Lieu :	Devant la mairie de Laversine à 09h30
---------------	---------------------------------------

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ru de Retz et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	FORETS ET PAYSAGES

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
BIARD Daniel	Président du syndicat	✓		
AUBRY Vincent	Union des syndicats	✓		
BESSEREAU Michel	Commune de Laversine	✓		
COTTIN Pierre	Maire de Laversine	✓		
LAURENT Sebastian	Entreprise FORETS ET PAYSAGES	✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓
LEBRETON Thomas	Entente Oise Aisne			✓


- Cette réunion de chantier concerne les travaux d'entretien du ru de Retz (tranche transitoire). Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux d'entretien du ru de Retz se poursuivent.
- L'entreprise se situe actuellement en aval du pont du chemin privé sur la commune de Laversine sur le tronçon RETZ 7bis.
- L'entreprise poursuivra les travaux d'entretien sur le tronçon OMAV si le niveau d'eau augmente.



Localisation de l'entreprise FORETS ET PAYSAGE

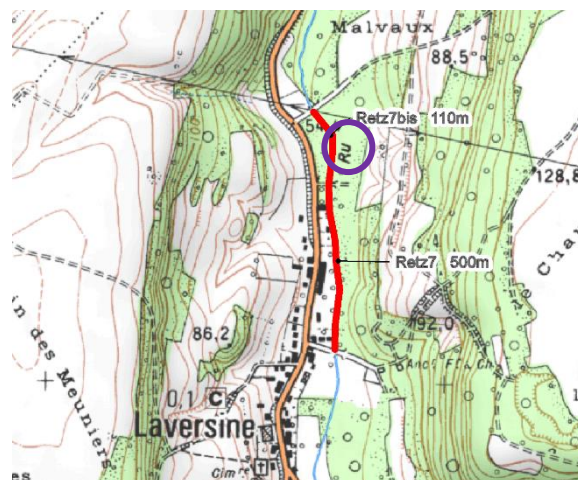

Tronçon Retz 7 avant travaux



Tronçon Retz 7 après travaux

DETAIL DES TRAVAUX :

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a commencé les travaux le lundi 25 juillet 2016. Comme convenu lors de la réunion de piquetage l'entreprise commence par le tronçon Retz7 sur la commune de Laversine.
- L'entreprise intervient manuellement sur les embâcles depuis le lit de la rivière.
- L'entretien est terminé sur le tronçon Retz7.
- Il reste à effectuer 50 mètres d'entretien du lit sur le tronçon Retz8. L'entreprise continuera les travaux en fin de semaine.
- Le tronçon Retz 4 sera réalisé cette semaine.
- La restauration du lit a permis de recréer un chenal central d'écoulement sur le ru de Retz. Les accélérations produites par la restauration favorisent la circulation des sédiments et limitent l'envasement des fonds. L'entreprise a veillé à conserver les ceintures végétales intéressantes en pied de berge. Les hélophytes de type iris, jonc, carex, ... n'ont donc subi aucune intervention.
- De nombreux embâcles gênants l'écoulement étaient présents dans le lit du ru de Retz. Le retrait des arbres cassés et des bois morts a entraîné un abaissement de la hauteur d'eau. Cette diminution de la ligne d'eau permet ainsi de retrouver des banquettes sédimentaires (limon et vase) qui commencent déjà à se végétaliser naturellement en hélophytes (habitats potentiels pour la faune locale).

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Les travaux sont financés par l'Agence de l'Eau Seine Normandie (40%) et le Conseil Départemental de l'Aisne (15%) sur la totalité des travaux. L'Entente Oise Aisne participe au financement des travaux sur la partie continuité écologique à hauteur de 20%.



- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien du ru de Retz, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :

M. Vincent AUBRY – Union des syndicats 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu le **jeudi 4 aout 2016 à 14h30** devant la mairie d'Ambleny.

Le service technique,
